


Визуализация участка 32 × 32 м

Аксонометрия: постройки, металлический забор из профлиста по всему периметру (ворота и калитка тоже), трассы подземных сетей.

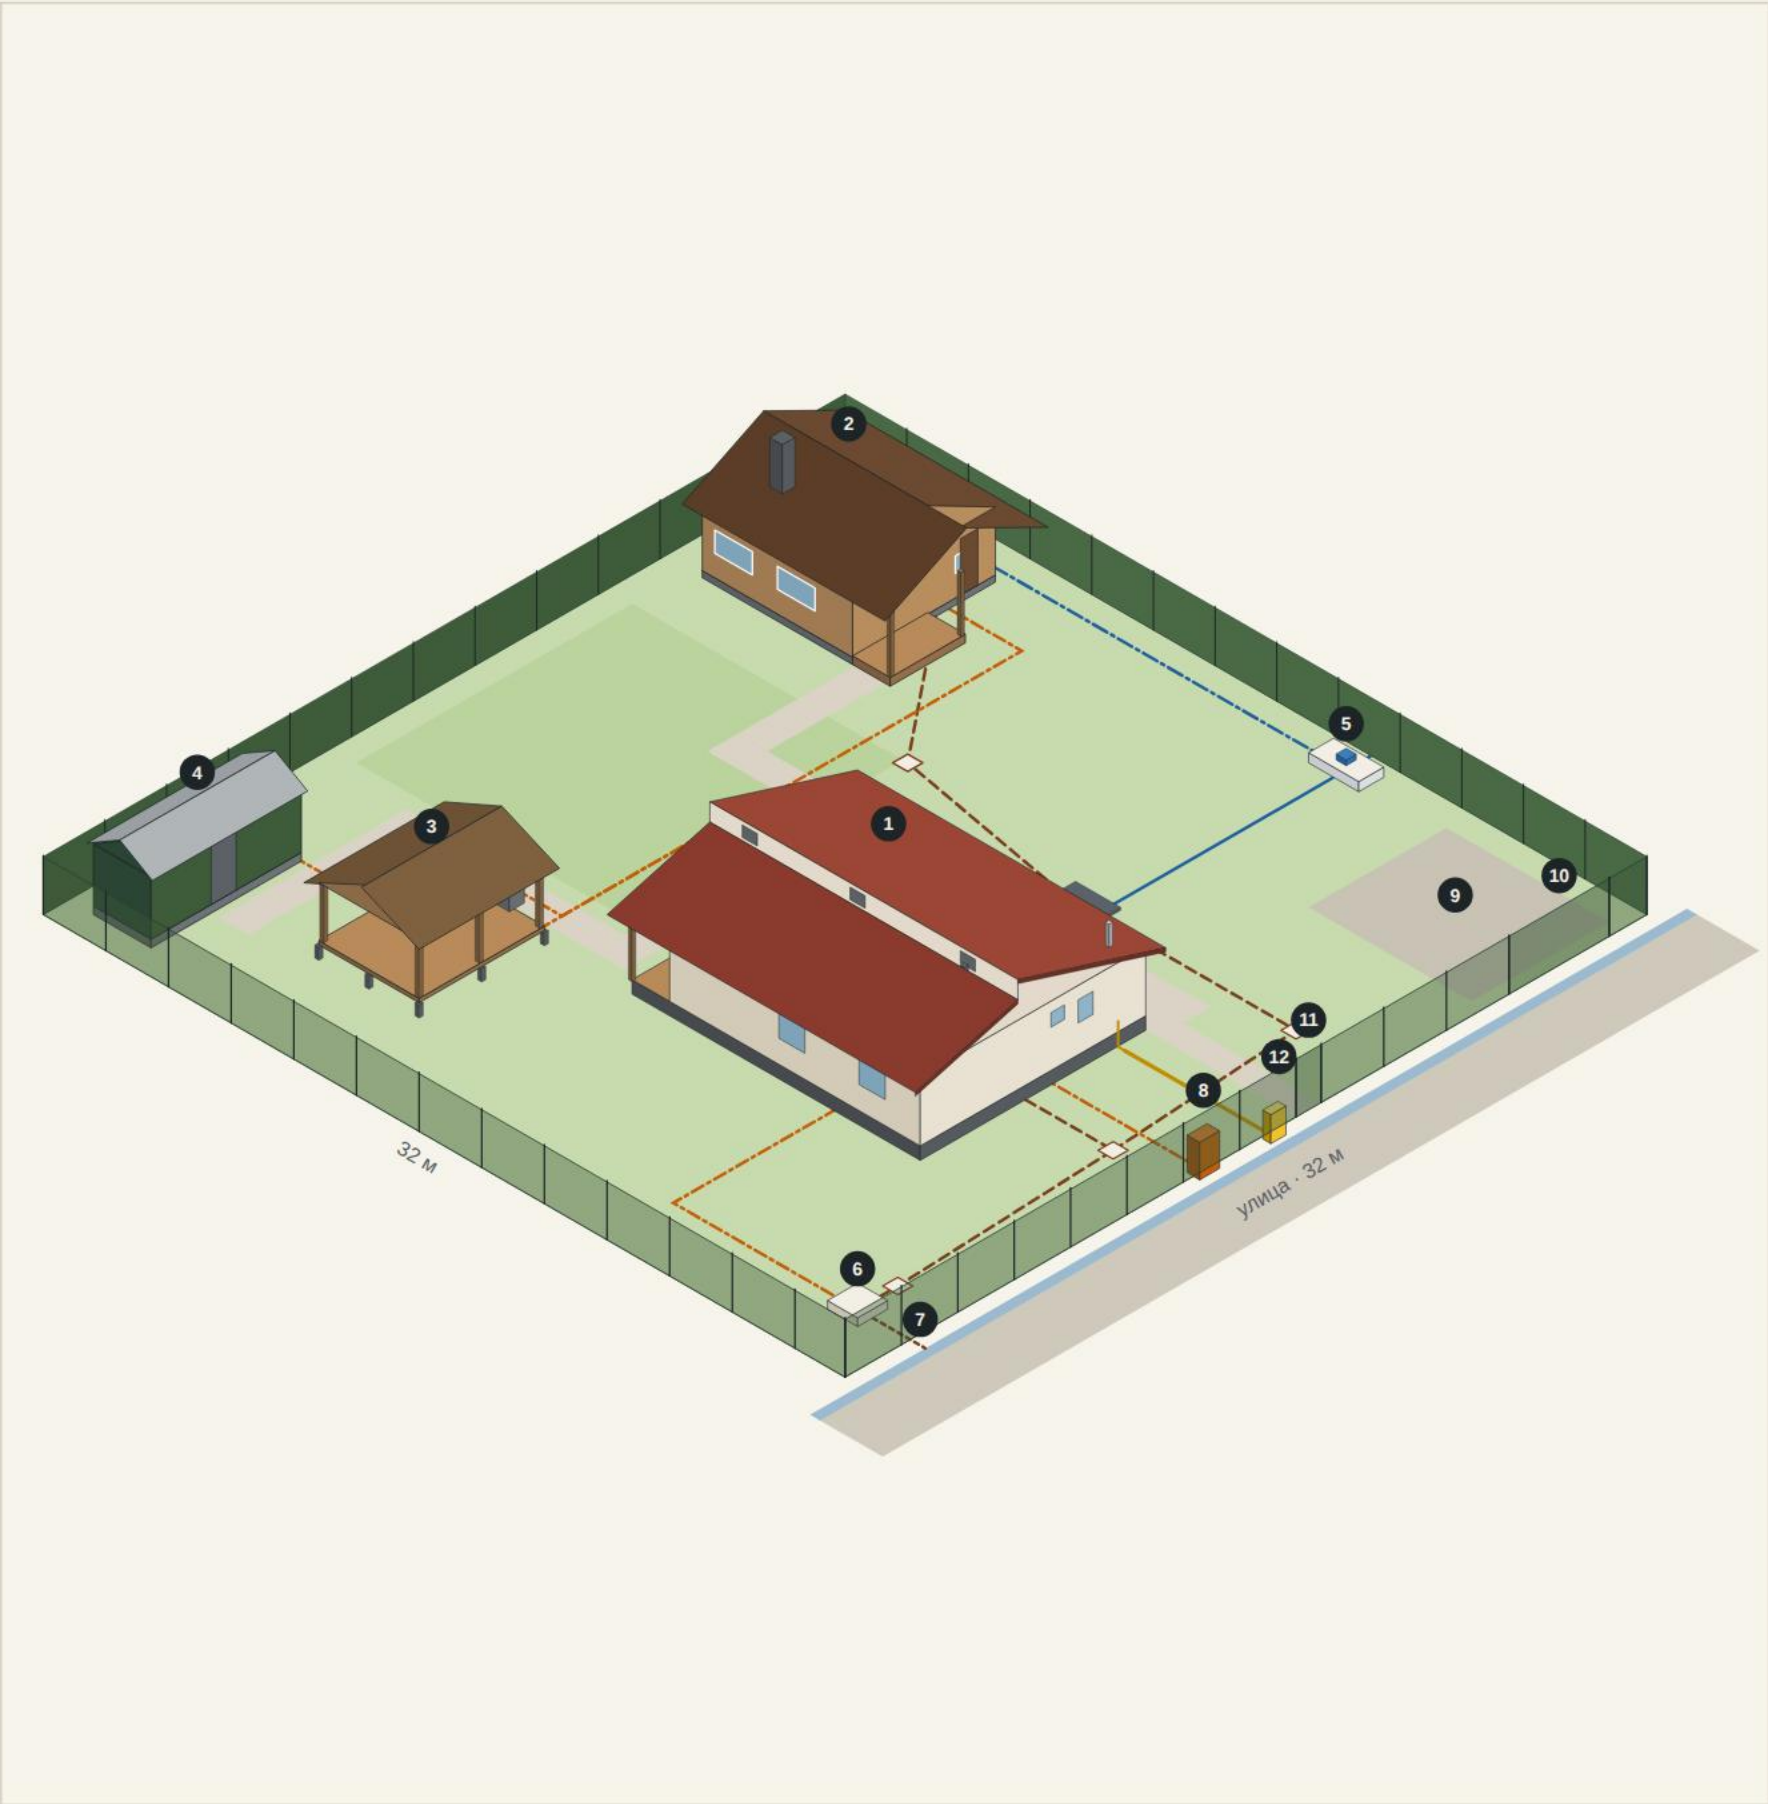

- 1 Дом каркасный 9,0×11,5 м, 94,7 м²: терраса в сад, вход со стороны калитки
- 2 Баня 5,7×6 м (лист 09)
- 3 Беседка 5×4 м на винтовых сваях
- 4 Хозблок 6,0×2,3 м
- 5 Скважина — общая с соседом
- 6 ЛОС (септик) у улицы
- 7 Выпуск очищенной воды в кювет
- 8 ВРУ: ввод 15 кВт
- 9 Стоянка у ворот
- 10 Откатные ворота 4,0 м
- 11 Калитка 1,0 м
- 12 Газовый шкаф ШГ, газопровод Г1

- Канализация К1
- Водопровод В1
- Кабели 0,4 кВ
- Газопровод Г1

Сети показаны проекцией трасс на поверхность.

10,24 сот.

площадь участка

171,5 м²

застройка: дом, баня, беседка, хозблок


123,0 м

забор: 53 столбов, все забетонированы

11 416 637 ₽

смета участка (лист 06)

Узел забора: столб, забетонированный на всю глубину

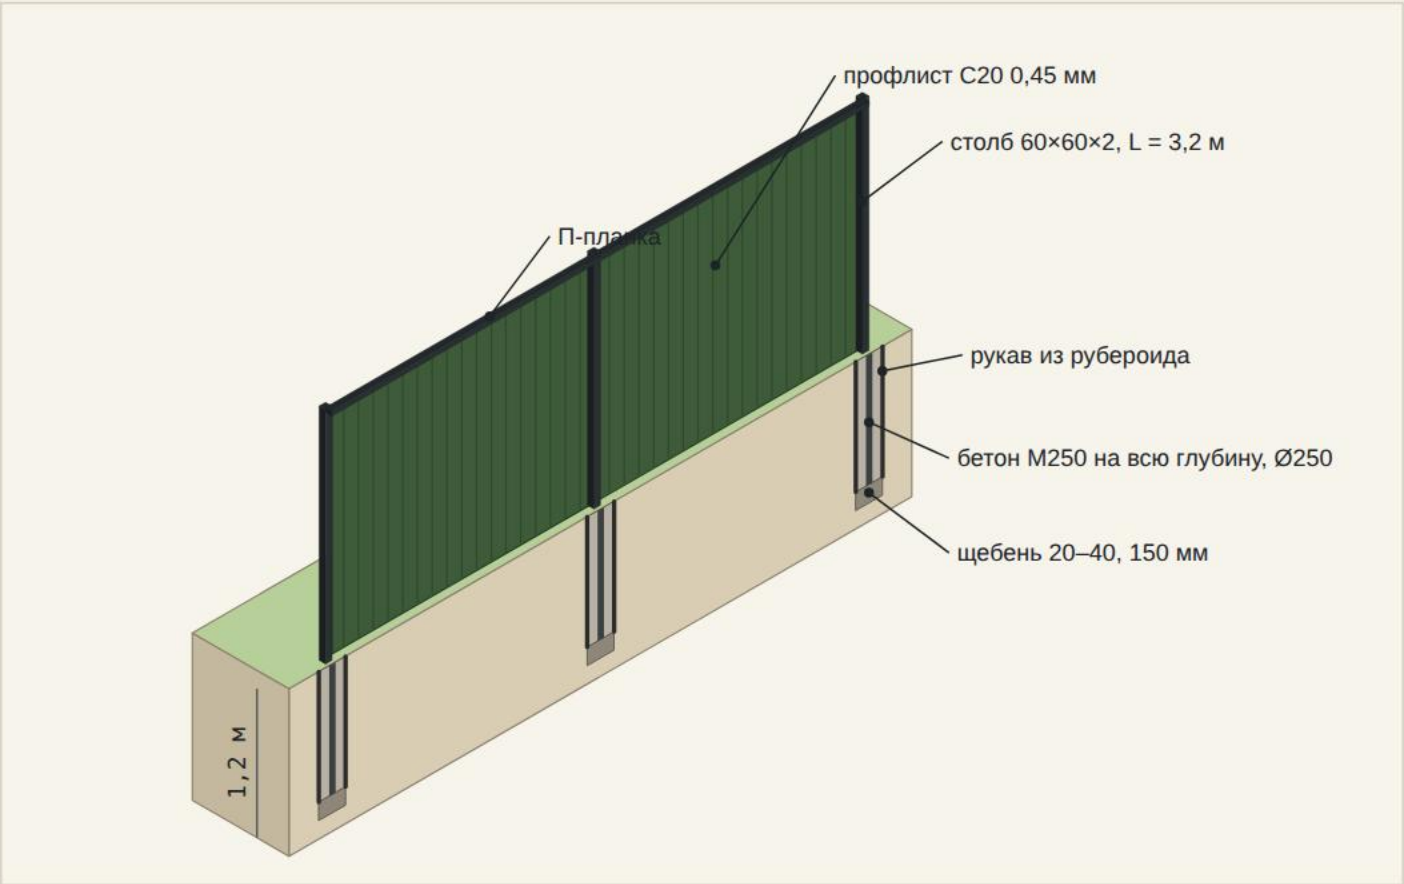


Как ставится столб

- Бурение скважины Ø250 мм на 1,2 м (у ворот и калитки — Ø300 на 1,3 м).
- На дно — щебень 20–40 слоем 150 мм, утрамбовать.
- В скважину — рукав из рубероида: он служит опалубкой, и по гладкой стенке грунт при пучении не выталкивает столб.
- Столб 60×60×2 длиной 3,2 м выставить по шнуру и уровню, закрепить подкосами.
- Залить бетон М250 на всю глубину, проштыковать, верх — с уклоном от столба.
- Через 7 суток — сварка лаг 40×20 в 2 ряда, грунт-эмаль, профлист на саморезы с EPDM, П-планка и заглушки.

Генеральный план участка

Каркасный дом 9,0×11,5 м по эскизу заказчика на месте модульного (9,0 м от левой границы, 6,0 м от улицы), развёрнут: терраса — в сад, вход — со стороны калитки. Сети перетрассированы под развёрнутый дом.

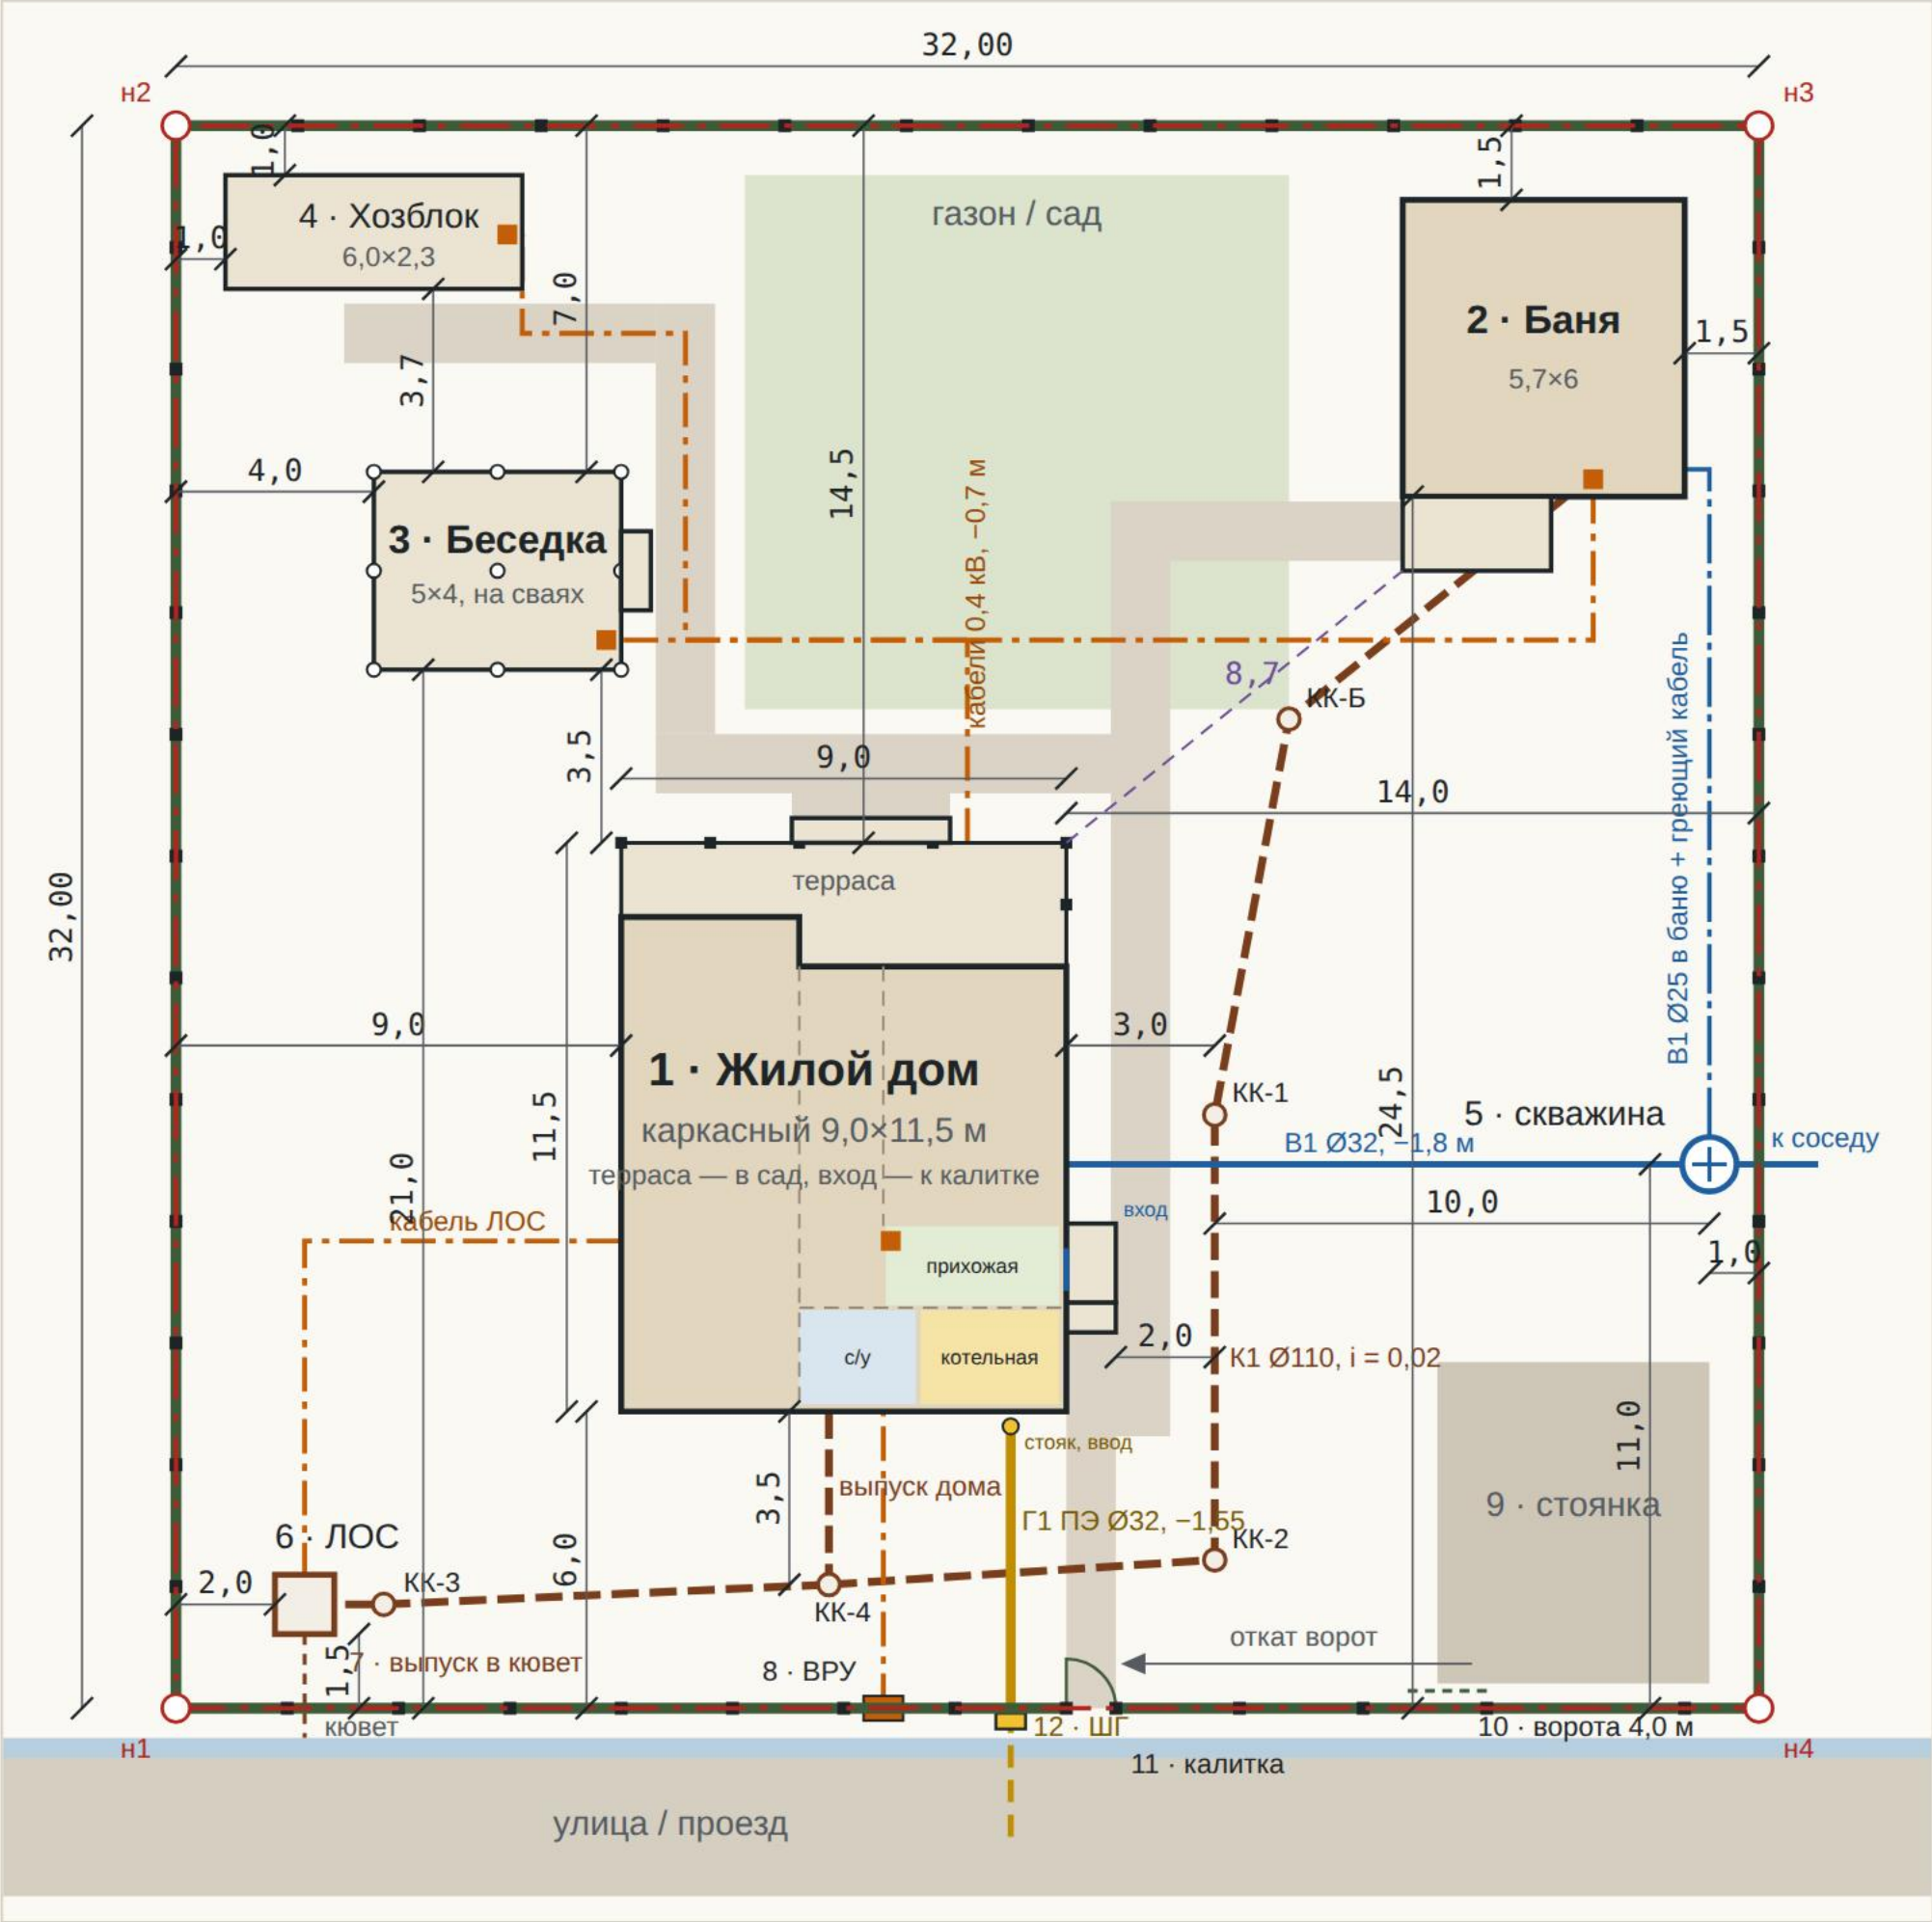

Условные обозначения

- Граница участка (н1-н4 — поворотные точки)

----- K1H — отвод очищенной воды Ø32

-.-.- Кабели 0,4 кВ в траншее

■ Щиты: ВРУ, ЩР-Д, щиты построек

○ Колодцы канализации КК

■ Дорожки, крыльцо, терраса

↗ Размеры и отступы, м
- Металлический забор из профлиста h 2,0 м, столбы в бетоне, шаг 2,5 м

— В1 — водопровод от скважины Ø32

— Г1 — газопровод низкого давления ПЭ Ø32 (лист 10)

⊕ Скважина в кессоне

○ Винтовые сваи беседки

■ Газон, сад
- K1 — самотёчная канализация Ø110

— В1 — в баню, Ø25 с греющим кабелем

■ ШГ — газовый шкаф: кран, регулятор, счётчик

■ ЛОС (станция биоочистки)

--- Г1 — стояк на уличном фасаде и ввод в котельную

■ Котельная дома (пом. 7)

Исходные данные Участок 32 × 32 м (10,24 сотки) — по данным заказчика. Дом — «Рабочий эскиз Заказчика. Дом 9.0х11.5 м каркасный», листы «Планы» и «Фасады, разрезы». План развёрнут и отзеркален: ось А (терраса) — к саду, ось Г — к улице, ось 1 (спальни) — слева, ось 3 (кухня, прихожая, вход) — справа. Стороны света — [\[уточнить по кадастру\]](#).

Экспликация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТ	ПЛОЩАДЬ
1	Жилой дом каркасный 9,0×11,5 м по эскизу заказчика, развёрнут: L-образная терраса 18,9 м² — в сад, вход через прихожую 5,6 м² — с правой стороны, от дорожки к калитке; спальни — слева, кухня-гостиная 17,5 м² — справа, санузел и котельная — у уличного фасада (лист 08)	9,0×11,5 м	94,7 м²
2	Баня: комната отдыха 8 м², спальня 3,7 м², раздевалка, парная, моечная, туалет, бойлерная 0,85 м² с уличной дверью; терраса (лист 09)	5,7×6,0 м	34,2 м²
3	Беседка открытая с зоной мангала, на 9 винтовых сваях (лист 07)	5,0×4,0 м	20,0 м²
4	Хозблок: мастерская и инвентарь (проект в репозитории)	6,0×2,3 м	13,8 м²
5	Скважина на известняк в кессоне у правой границы — общая с соседом, отвод к соседу под забором	Ø1,0 м	—
6	Локальные очистные (ЛОС) у улицы, 5 пользователей; обслуживание с улицы	1,1×1,2 м	—
7	Выпуск очищенной воды в придорожный кювет (по согласованию)	ПНД Ø32	—
8	Шкаф учёта (ВРУ) на границе, ввод 15 кВт / 380 В — сдвинут на пролёт влево, чтобы газовый шкаф встал в 1,9 м от него	—	—
9	Стоянка у ворот	5,5×6,5 м	35,8 м²
10	Откатные ворота из профлиста C20, проём 4,0 м, зона отката 7,5 м	4,0 м	—
11	Калитка из профлиста C20 с замком, вход к дому	1,0 м	—
12	Газовый шкаф ШГ на границе левее калитки (кран, регулятор, счётчик G4); Г1 под землёй по прямой 5,8 м к уличному фасаду и ввод прямо в котельную (лист 10)	0,6×0,3 м	—

Проверка расстояний

РАССТОЯНИЕ, М	НОРМА	ФАКТ	ОСНОВАНИЕ
Дом — уличная граница (уличный фасад, ось Г)	≥ 5,0	6,0 норма	ПЗЗ, СП 42.13330
Дом — граница с соседом, слева / справа	≥ 3,0	9,0 / 14,0 норма	СП 53.13330, п. 6.7
Баня — дом (терраса дома — терраса бани)	≥ 8,0	8,7 норма	СП 53.13330, п. 6.8
Беседка — дом (проход, дорожка)	≥ 2,0	3,5 норма	проход, обслуживание
Скважина — ЛОС	≥ 20,0	29,2 норма	рекомендация, ЗСО
Скважина — канализация K1 (линия бани)	≥ 10,0	10,0 норма	рекомендация · без запаса
K1 (линия бани) — фундамент дома	≥ 3,0	3,0 норма	СП 42.13330, табл. 12.6
K1 (линия бани) — сваи крыльца входа	—	2,0 уточнить	крыльцо отдельное, на 2 сваях ниже промерзания
ЛОС — фундамент дома	≥ 5,0	6,7 норма	паспорт ЛОС
ЛОС — уличная граница (подъезд)	≥ 1,0	1,5 норма	обслуживание с улицы
Колодец КК-4 — фундамент дома	≥ 3,0	3,5 норма	СП 42.13330, табл. 12.6
Г1 — фундамент дома, параллельно	≥ 2,0	нет норма	СП 62.13330, прил. В · подход под прямым углом
Г1 — выпуск K1 дома, параллельно	≥ 1,0	3,7 норма	СП 62.13330, прил. В
Г1 — K1 на пересечении, по вертикали	≥ 0,2	0,43 норма	СП 62.13330, прил. В · Г1 ниже
Г1 — кабель ВРУ → ЩР-Д, параллельно	≥ 1,0	2,6 норма	ПУЭ, гл. 2.3
ШГ — шкаф учёта ВРУ	≥ 1,0	1,9 норма	ПУЭ, п. 7.1.28
Кабель бани — K1 бани на пересечении	≥ 0,25	0,05 → 0,30 исправлено	ПУЭ 2.3 · кабель заглубить до −0,95 в гофре
Застройка участка (171,5 м² из 1024)	≤ 40 %	16,7 % норма	ПЗЗ, зона Ж-2 [уточнить]

Забор из профлиста

Периметр участка {{{plotLabel}}}: откатные ворота 4,0 м, калитка 1,0 м. Количество и стоимость пересчитываются от параметров в «Tweaks».

02

{{{kL}}} м

длина забора (без проёмов)

{{{kPosts}}}

столбов, включая 4 у ворот и калитки

{{{kSheets}}}

листов профнастила, {{{kArea}}} м²


{{{perM}}} ₹

за погонный метр, всё включено

{{{total}}} ₹

итого: материалы и работы

Типовая секция · вид со стороны участка

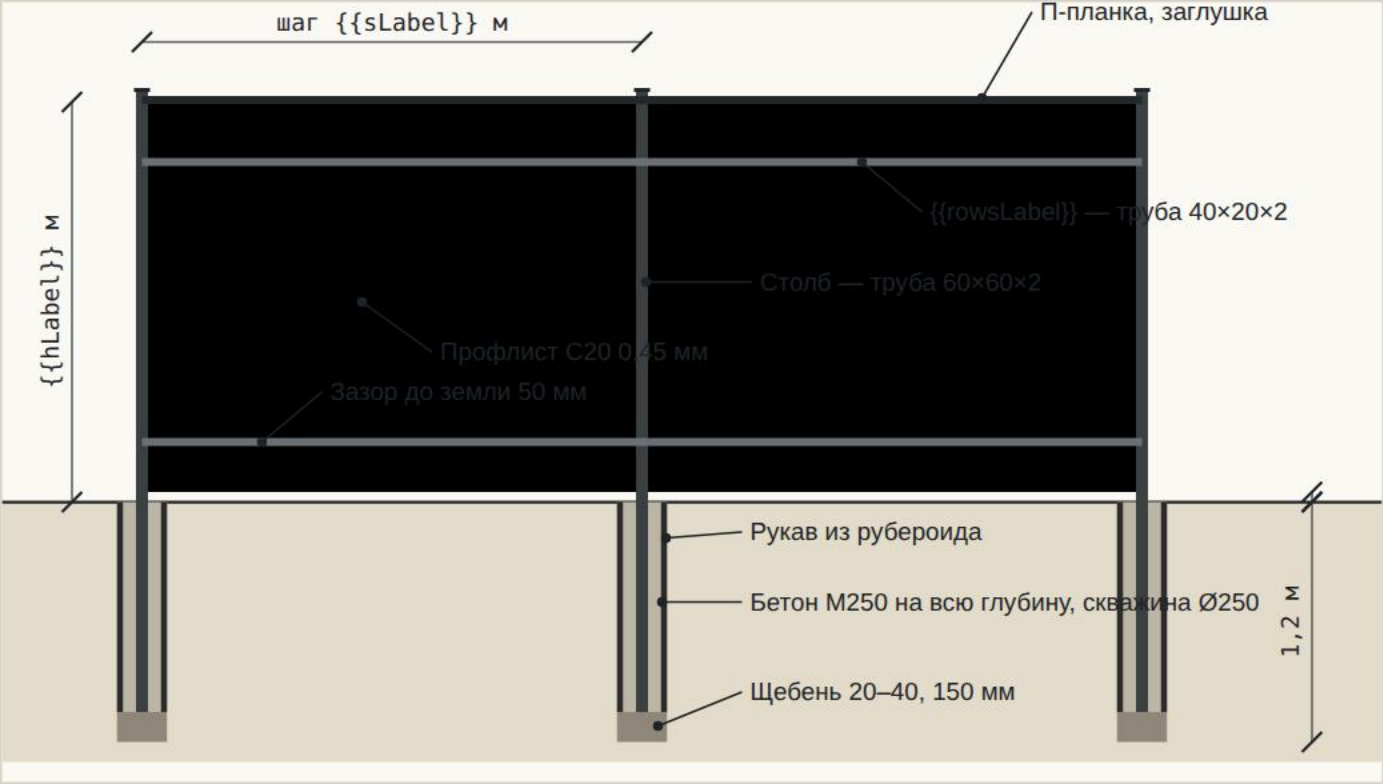

УЧАСТОК ЗАБОРА	ДЛИНА, М	ПРОМЕЖ. СТОЛБОВ	ЛИСТОВ
{{{r.name}}}	{{{r.len}}}	{{{r.posts}}}	{{{r.sheets}}}

Решения

- Забор металлический по всему периметру: столбы и лаги из профильной трубы, обшивка профлистом С20 0,45 мм одного цвета — улица, соседи, тыльная сторона, ворота и калитка. Ось столбов — на 0,1 м внутрь участка.
- Все столбы бетонируются на всю глубину: бурение Ø250 мм на 1,2 м (у ворот и калитки — Ø300 на 1,3 м), щебень 150 мм, рукав из рубероида, бетон М250 с вибрированием. Профлист и лаги — через 7 дней, когда бетон наберёт прочность.
- Ворота откатные: противовес 1,6 м, зона отката 7,5 м — по уличному забору в сторону калитки; фундамент — швеллер 16П на бетонном ростверке 2,0×0,4×1,2 м. Можно поставить привод (опция).
- Глухой забор 2 м по границам с соседями — по ПЗЗ Чеховского г.о. и согласованию с соседями (проверить допустимую высоту).

Расчёт материалов и стоимости

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₹	СУММА, ₹
МАТЕРИАЛЫ					
{{{i.n}}}	{{{i.name}}}		{{{i.unit}}} {{{i.qty}}}	{{{i.price}}}	{{{i.sum}}}
Итого материалы					{{{mSum}}}
РАБОТЫ					
{{{i.n}}}	{{{i.name}}}		{{{i.unit}}} {{{i.qty}}}	{{{i.price}}}	{{{i.sum}}}
Итого работы					{{{wSum}}}
Всего по забору					{{{total}}}

Цены ориентировочные: розница Московской обл., сентябрь 2026. Лист профнастила — ширина 1,15 м, полезная 1,10 м. Саморезы: 6 шт на лист на ряд лаг.

Канализация под домом и баней


Дом 9,0×11,5 развёрнут террасой в сад: коллектор под полом у уличного фасада, выпуск через уличную стену в КК-4. Баня на УШП. Линия бани обходит дом справа в 3,0 м, линии сходятся в КК-4 и идут к ЛОС у улицы.

Дом 9,0×11,5 · сети под полом



М — мойка, Д — душ (трап), У — унитаз, Ум — умывальник, СМ — стиральная машина, Рв — ревизия в начале коллектора (котельная: конденсат котла, трап). Ст К1-1 — фановый стояк у унитаза. Трубы в подполье подвешены на хомутах с уклоном 0,02 и закрыты утеплителем цоколя.

Баня 5,7×6 · сети под полом (без изменений)

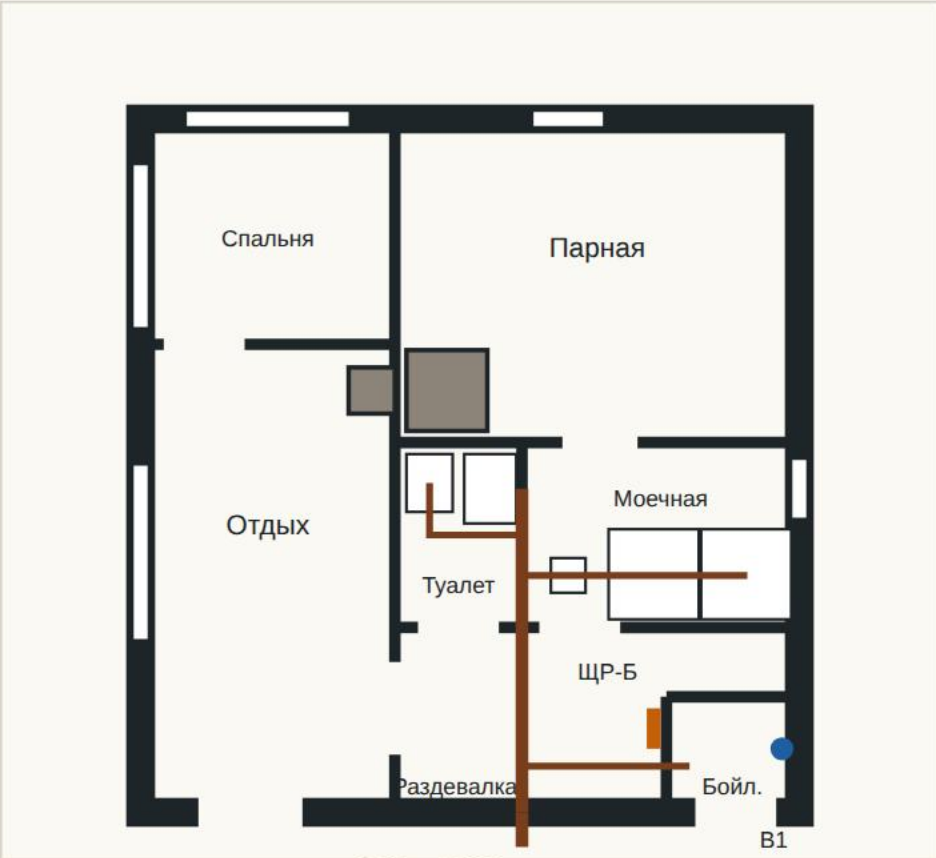


Баня на утеплённой плите (УШП): трубы закладываются до заливки. Выпуск бани −0,55 → КК-Б.

Отметки и уклоны

участок К1	длина, м	уклон	лоток, м
Выпуск дома → КК-4 (через уличную стену)	3,50	0,020	−0,85 → −0,92*
Выпуск бани → КК-Б	7,18	0,020	−0,55 → −0,69
КК-Б → КК-1	8,14	0,020	−0,69 → −0,86
КК-1 → КК-2	9,00	0,020	−0,86 → −1,04
КК-2 → КК-4	7,82	0,020	−1,04 → −1,19
КК-4 → КК-3	9,01	0,020	−1,19 → −1,37
КК-3 → ЛОС (вход)	1,00	0,020	−1,37 → −1,39

* в КК-4 перепад до отметки магистрали КК-2 → КК-3.

Продольный профиль К1: дом → ЛОС

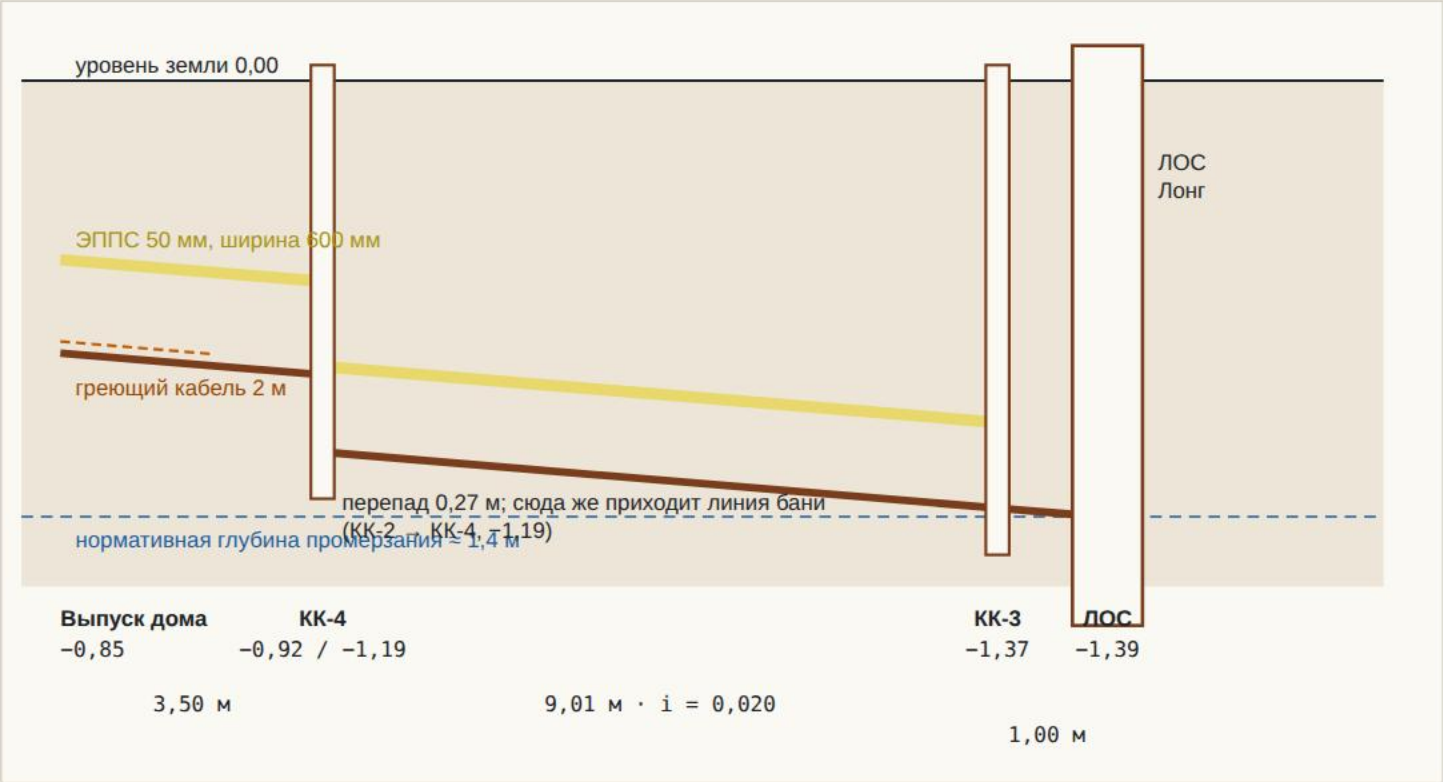

Спецификация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Труба ПВХ Ø110×3,2 SN4 наружная, 3 м (К1 ≈ 46 м + запас)	шт	18	950	17 100
2	Труба ПП Ø50 (под полом дома и бани), 1 м	шт	10	190	1 900
3	Фасонные части Ø110: отводы 15-45°, косые тройники, ревизии	компл	1	9 000	9 000
4	Фасонные части Ø50	компл	1	2 500	2 500
5	Колодец ревизионный ПВХ Ø315 с лотком, трубой и люком (КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-Б)	шт	5	7 500	37 500
6	Трап с сухим затвором для моечной бани	шт	1	4 800	4 800
7	Трап котельной (конденсат котла, дренаж водоподготовки, СМ)	шт	1	3 200	3 200
8	ЭППС 50 мм над трубой, упаковка 4,85 м² (46 м × 0,6 м)	уп	6	2 400	14 400
9	Песок для подушки и обсыпки труб	м³	6	1 000	6 000
10	Фановая труба Ø110 на кровлю + аэратор (Ст К1-1)	компл	1	5 500	5 500
11	Земляные работы: траншея К1 ≈ 46 м, глубина 0,8-1,5 м (у ЛОС — 1,4 м + постель)	м	46	510	23 460
12	Монтаж наружной К1: трубы, колодцы, утепление	компл	1	19 000	19 000
13	Разводка К1 под полом дома (коллектор Ø110 ≈ 5 м с подвесом и утеплением, Ø50 от мойки 2,5 м) и под плитой бани	компл	1	15 000	15 000
14	Утеплённый выпуск через уличную стену: ЭППС-скорлупа, греющий кабель 2 м, гильза в цоколе	компл	1	7 500	7 500


Итого канализация (без ЛОС)

166 860

Скважина и септик


Скважина на известняк в кессоне, водопровод в дом и баню. Станция биоочистки (ЛОС) с отводом очищенной воды в кювет.

Скважина · разрез (схема)

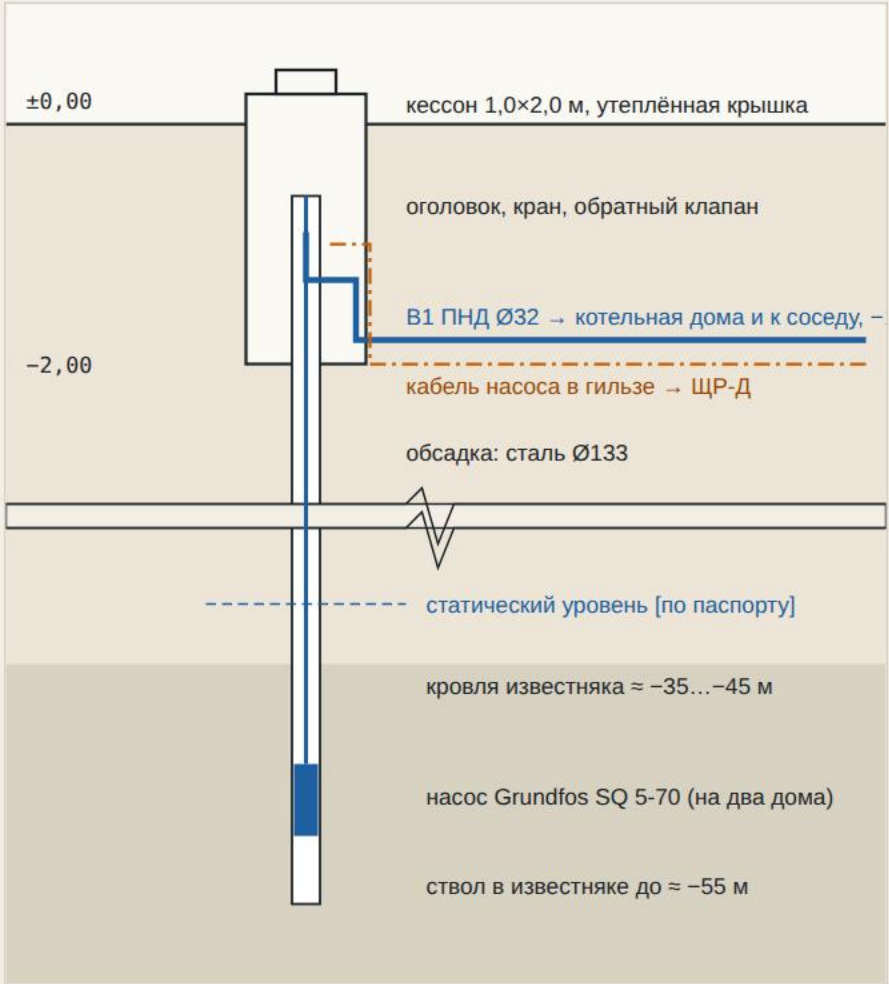

1. Глубину и водоносный горизонт уточняет буровая по соседним скважинам в Гришино. Для Чеховского района типичен известняк на 40–60 м.
2. Скважина — в кессоне у правой границы, в 1,0 м от забора: общая с соседом. От оголовка в кессоне два выхода: наш — ПНД Ø32 в котельную дома, соседский — ПНД Ø32 в гильзе под забором, со своим краном и счётчиком. Насос на два дома — 5 м³/ч. Нужно письменное соглашение о совместном пользовании и долях расходов (обычно 50/50); соседский септик — тоже не ближе 20 м от скважины. Буровая заезжает через ворота вдоль правой границы.
3. Траншея В1 от кессона идёт прямо к правой стене дома (12,5 м), ввод в подполье — в 5,0 м от уличного фасада, в стороне от крыльца входа (1,2 м); дальше 4,3 м по утеплённому подполью в котельную у уличного фасада. Автоматика и гидроаккумулятор — в котельной, до санузла и кухни 1–3 м. Под линией канализации бани (у КК-1) В1 проходит в стальном футляре по 5 м в обе стороны: водопровод глубже канализации. Водоподготовку (обезжелезивание, умягчение) подбирают по анализу воды, в итог она не включена.

ЛОС · разрез (схема)

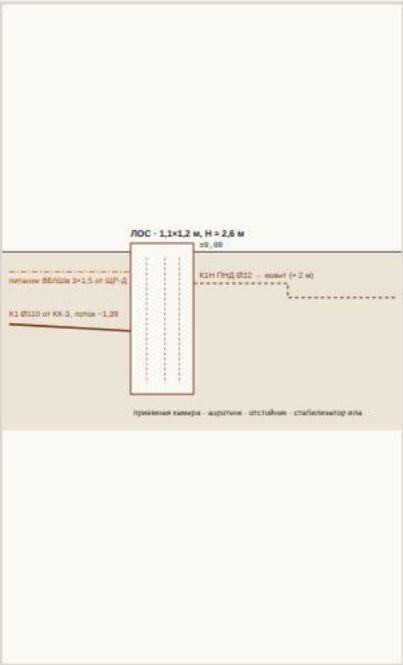

Спецификация: вода

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Бурение скважины на известняк ≈ 55 м с обсадкой сталь Ø133 [метраж по факту]	м	55	3 700	203 500
2	Кессон пластиковый 1,0×2,0 м с горловиной	шт	1	42 000	42 000
3	Обустройство: монтаж кессона, оголовок, запорная арматура, выход трубы	компл	1	38 000	38 000
4	Насос скважинный Grundfos SQ 5-70 (или аналог), 5 м³/ч — на два дома	шт	1	128 000	128 000
5	Отвод к соседу: тройник и кран в кессоне, счётчик воды, ПНД Ø32 в гильзе под забором	компл	1	9 500	9 500
6	Кабель насоса 4×1,5, трос из нержавеющей стали, хомуты, 60 м	компл	1	12 000	12 000
7	Гидроаккумулятор 100 л, реле давления, манометр, пятивыводник, фильтр	компл	1	18 500	18 500
8	Труба ПНД Ø32 PN16: кессон → ввод в подполье (13 м) + по подполью до котельной (4,5 м) в утеплении с греющим кабелем	компл	1	10 200	10 200
9	Траншея В1 глубиной 1,8 м, 13 м	м	13	1 400	18 200
10	Футляр стальной Ø89×3,5 на пересечении В1 с К1 бани у КК-1, 10 м (по 5 м в обе стороны), с герметизацией торцов	м	10	950	9 500
11	В1 в баню: ПНД Ø25 в скорлупе ППУ + саморегулирующийся кабель 16 Вт/м, 17 м	компл	1	35 000	35 000
12	Траншея В1 в баню глубиной 0,6 м, 14 м, с монтажом	м	14	900	12 600
13	Анализ воды: химический и микробиологический	шт	1	6 500	6 500

Итого скважина и водоснабжение

543 500

Почему ЛОС, а не накопитель

Дом и баня дают около 0,8 м³ стоков в сутки. Накопительную ёмкость 8 м³ пришлось бы откачивать раз в 1–2 недели. ЛОС на 5 человек (1,0 м³/сут, залповый сброс 250 л) очищает воду на 95–98 %, ил откачивается раз в 3–6 месяцев собственным насосом станции.

ЛОС стоит у улицы слева от калитки, в 1,5 м от забора: к ней подъезжает ассенизатор, а очищенная вода уходит в придорожный кювет коротким выпуском (по согласованию с администрацией). До скважины — 29,8 м, до фундамента дома — 6,7 м (угол дома на прежнем месте).

Электропитание: 220 В, ≈ 1,5 кВт·ч/сут. Нужен свободный доступ к крышке для обслуживания.

Спецификация: ЛОС

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	ЛОС Юнилос Астра 5 Лонг Пр (или аналог; глубокий вход до 1,4 м, принудительный отвод)	шт	1	165 000	165 000
2	Монтаж ЛОС: котлован, песчаная подушка, обсыпка, подключение	компл	1	48 000	48 000
3	Напорный трубопровод ПНД Ø32 до кювета, 6 м	м	6	90,0	540
4	Траншея под К1Н глубиной 0,8 м с уклоном к кювету (опорожняется)	м	4	450	1 800
5	Оголовок выпуска: лоток, бетонная подушка, обратный клапан	компл	1	9 500	9 500

Итого ЛОС и отвод очищенной воды


224 840

Электроснабжение участка

Ввод 15 кВт / 380 В, учёт на границе участка. От главного щита дома отдельные линии к бане, беседке, хозблоку, насосу скважины и ЛОС.

05

Однолинейная схема

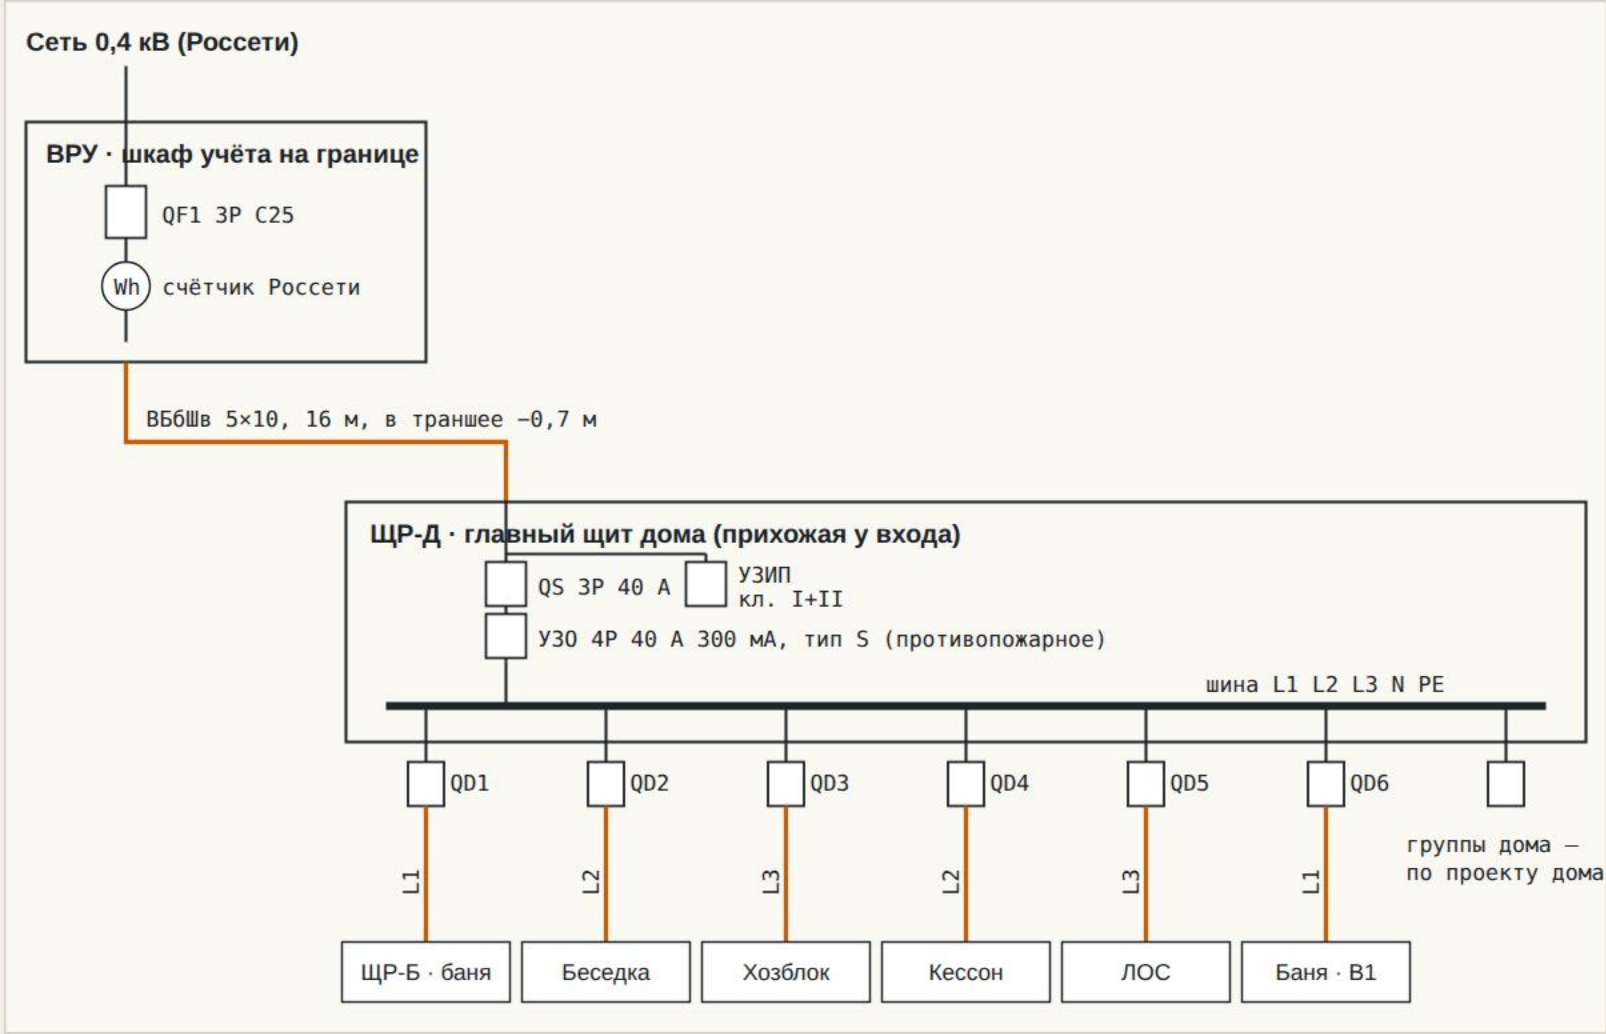

Линии участка

линия	ПОТРЕБИТЕЛЬ	Р, кВт	ФАЗА	КАБЕЛЬ	L, м	ЗАЩИТА	ΔU, %
QD1	Баня: свет, розетки, водонагреватель 2 кВт, тёплый пол	4,50	L1	ВБбШв 3×6	35	АВДТ C25, 30 мА	1,74
QD2	Беседка: свет, розетки, электрогриль	3,50	L2	ВБбШв 3×2,5	27	АВДТ C16, 30 мА	2,50
QD3	Хозблок: свет, розетки под инструмент	3,50	L3	ВБбШв 3×4	37	АВДТ C16, 30 мА	2,14
QD4	Насос скважины SQ 5-70 (общий с соседом)	1,70	L2	ВБбШв 3×2,5	24	АВДТ C16, 30 мА	1,08
QD5	ЛОС: компрессор, насос	0,20	L3	ВБбШв 3×1,5	25	АВДТ C10, 30 мА	0,22
QD6	Греющий кабель В1 в баню (ветка от кессона, термостат)	0,45	L1	в составе трубы	17	АВДТ C10, 30 мА	–

Длина кабеля — трасса по генплану плюс 6 м: спуск от ЩР-Д в подполье и траншею ≈ 2,9 м, подъём к щиту постройки ≈ 2,1 м, запас ≈ 1 м. Кабели к постройкам идут по подполью дома и выходят в грунт под террасой (ось В, в 1,0 м от ряда свай), кабель ЛОС — у левой стены, насоса — у правой (вместе с В1), ввод от ВРУ — через уличную стену. ΔU — падение напряжения при полной нагрузке, допустимо до 5 %.



1. Система заземления TN-C-S: разделение PEN в ЩР-Д, контур у дома, повторные заземления у бани и хозблока.
2. Расстояния по ПУЭ 2.3: до фундаментов не менее 0,6 м, до трубопроводов не менее 0,5 м, на пересечениях — в трубе, не менее 0,25 м. Кабель бани пересекает К1 бани у КК-Б, где труба лежит на –0,65: кабель там заглубить до –0,95 в гофре на 4 м (зазор 0,30 м; в прежнем варианте было 0,05 м).
3. В парной — кабель и светильники, рассчитанные на 125 °С, в моечной — IP44. Печь дровяная, электрокаменка не нужна.
4. Мощность 15 кВт покрывает дом с газовым или твердотопливным котлом. Для электроотопления нужна отдельная заявка на большую мощность.

Спецификация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Шкаф учёта на границе: стойка, бокс IP65, QF1 3P C25 (счётчик ставит Россети)	компл	1	17 000	17 000
2	Кабель ВБбШв 5×10 (ввод ВРУ → ЩР-Д)	м	16	1 150	18 400
3	Кабель ВБбШв 3×6 (баня)	м	35	520	18 200
4	Кабель ВБбШв 3×4 (хозблок)	м	37	390	14 430
5	Кабель ВБбШв 3×2,5 (беседка, насос)	м	51	280	14 280
6	Кабель ВБбШв 3×1,5 (ЛОС)	м	25	200	5 000
7	Гофротруба ПНД двустенная Ø63	м	90	110	9 900
8	Лента сигнальная, песок для кабельных траншей	компл	1	4 600	4 600
9	ЩР-Д: QS 3P 40 А, УЗИП, УЗО 4P 300 мА (S), 6 АВДТ для линий участка	компл	1	40 800	40 800
10	Баня: щит IP65, кабель, светильники парной (до 125 °С), розетки IP44	компл	1	37 500	37 500
11	Беседка: щит IP65, 3 светильника и 3 розетки IP54	компл	1	15 200	15 200
12	Хозблок: щиток, 2 светильника, 4 розетки (опция сметы хозблока без кабеля)	компл	1	16 000	16 000
13	Заземление: контур дома + повторные у бани и хозблока	компл	1	21 000	21 000
14	Кабельные траншеи 0,7 м с обратной засыпкой, ≈ 60 м	м	60	600	36 000
15	Работы: прокладка кабелей (в т. ч. по подполью дома в гофре), вводы в здания, сборка щитов, расключение	компл	1	38 000	38 000
16	Электромонтаж в бане и беседке	компл	1	32 000	32 000
17	Измерения ЭТЛ: сопротивление изоляции и заземления, проверка УЗО	компл	1	9 000	9 000

Итого электроснабжение участка	347 310
---------------------------------------	----------------

Не входит: плата за технологическое присоединение по договору с Россети — [сумма по договору ТП]; электропроводка внутри дома — в смете дома.

Сводная смета и порядок работ

Цены ориентировочные: розница и работы Московской обл., сентябрь 2026.

11 416 637 ₺

участок под ключ: дом, баня, беседка, хозблок, забор, сети, скважина, ЛОС, электричество, газ

№	РАЗДЕЛ	ГДЕ	СУММА, ₺
1	Забор из профлиста с воротами и калиткой	лист 02	640 904
2	Канализация под домом и баней, наружная K1	лист 03	166 860
3	ЛОС и выпуск очищенной воды в кювет	лист 04	224 840
4	Скважина, кессон, насос, водопровод в дом и баню	лист 04	543 500
5	Электроснабжение участка: ввод, щиты, линии к постройкам	лист 05	347 310
6	Хозблок 6,0×2,3 м с наполнением (готовая смета)	репозиторий	385 334
7	Беседка 5×4 м на винтовых сваях	лист 07	399 270
8	Дом каркасный 9,0×11,5 м под ключ по эскизу заказчика, развёрнут, с прихожей и крыльцом у калитки (ориентир)	лист 08	5 528 600
9	Баня 5,7×6 м под ключ (ориентир)	лист 09	2 311 000
10	Газоснабжение: шкаф на границе, Г1 5,8 м, стояк и ввод, котельная, дымоход, вентиляция	лист 10	325 370
Итого по позициям 1-10			10 872 988
Непредвиденные расходы 5 %			543 649
Всего по участку			11 416 637

Не входит в сумму

Водоподготовка (подбирается по анализу, ориентир 80–120 тыс. ₺), плата за техприсоединение по договору с Россети, плата за подключение газа до границы (0 ₺ по догазификации), благоустройство (дорожки, стоянка, газон), привод откатных ворот.

Порядок работ

- 1

Геодезия
Вынос границ н1–н4 в натуру, топосъёмка с отметками. Заявка на техприсоединение 15 кВт в Россети, запрос в Мособлгаз о газе в Гришино.
- 2

Скважина
Соглашение с соседом, бурение у правой границы и кессон с отводом к соседу — пока участок открыт для техники. Анализ воды.
- 3

Ввод электричества
Шкаф учёта на границе в пролёте 13,5–15,75 м (не у калитки — там газовый шкаф), временный щит для стройки.
- 4

Забор и ворота
Столбы, лаги, профлист. Ворота — после проезда тяжёлой техники.
- 5

Сваи дома, плита бани
Винтовые сваи дома (34 + 4 под ступени) и обвязка; под УШП бани закладываются K1 и B1, затем плита заливается.
- 6

Каркас дома
Каркас по зеркальному плану (терраса в сад, вход к калитке), кровля, контур; прихожая с входной дверью в правой стене; котельная сразу с окном, дверью 0,86 и потолком 2,5 м; утеплённый цоколь с гильзами под B1, K1, газ и кабели; крыльцо входа.
- 7

ЛОС и наружная K1
Котлован, ЛОС, колодцы КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-Б (линия бани — строго в 3,0 м от дома), выпуск через уличную стену, напорная линия в кювет.
- 8

Кабели и B1 в баню
Траншеи 0,7 м по генплану, кабели в гофре (у КК-Б кабель бани — на –0,95), водопровод с греющим кабелем.
- 9


Постройки
Хозблок по проекту, беседка на винтовых сваях (лист 07), подключение щитов и замеры ЭТЛ.
- 10

Газ
После регистрации дома — заявка на догазификацию, ТУ и проект. Траншея Г1 от ШГ по прямой к уличному фасаду (5,8 м) — вместе с магистралью K1 КК-2 → КК-4; стояк на фасаде — после обшивки (лист 10).


Беседка 5×4 м на винтовых сваях

Открытая каркасная беседка: 9 винтовых свай, брусовый ростверк, пол из лиственницы, двускатная кровля 25°, зона мангала.

Вид с участка · сваи показаны сквозь грунт

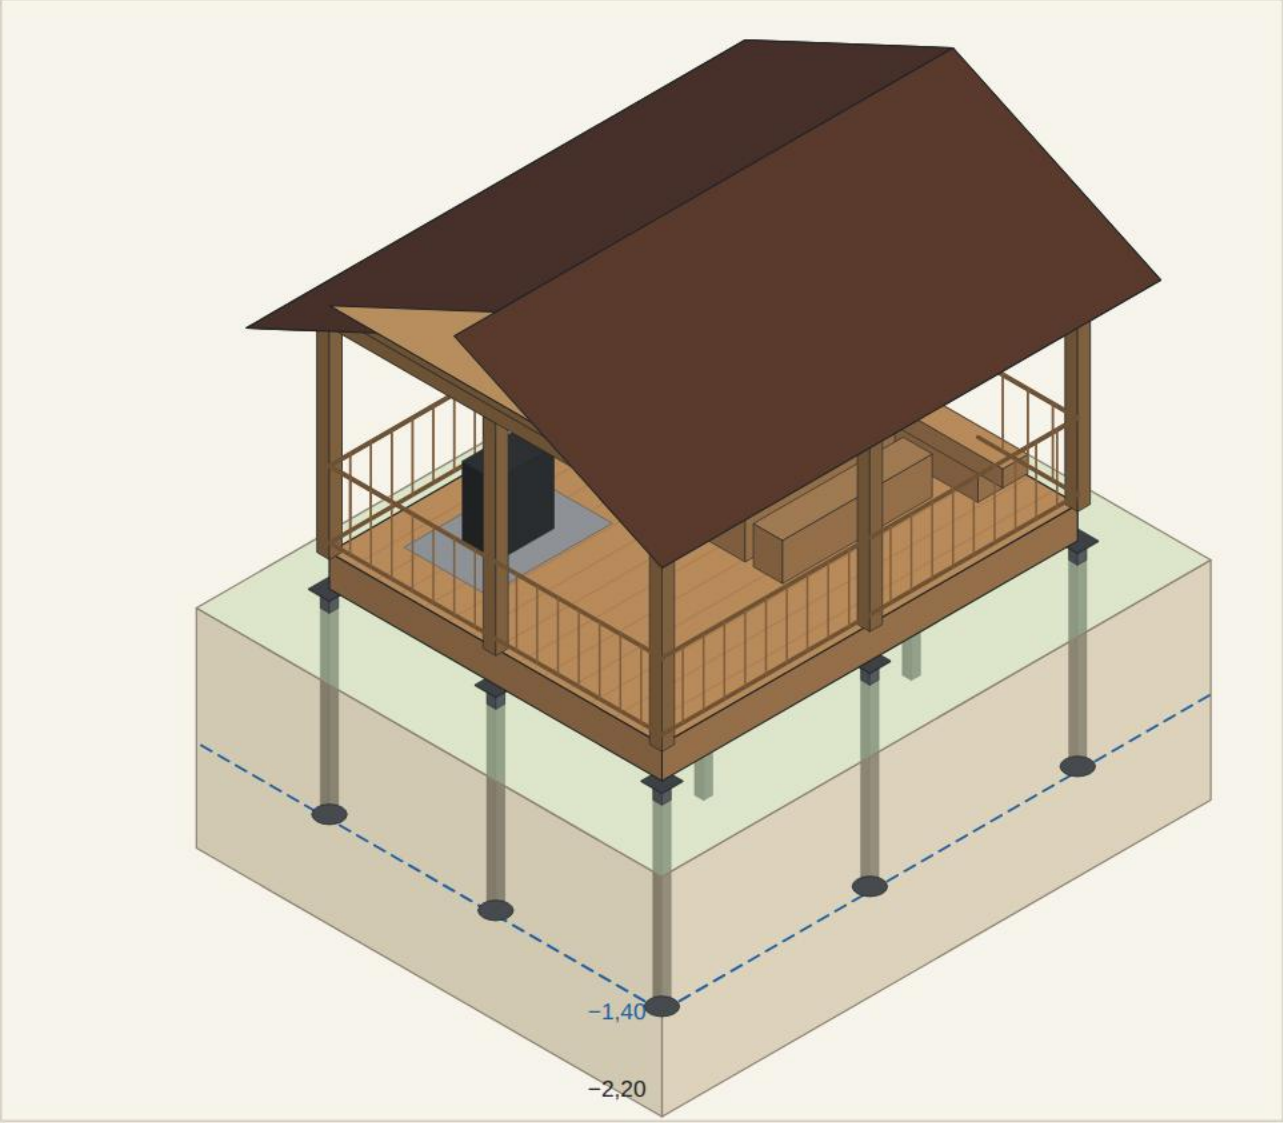

План свайного поля и пола

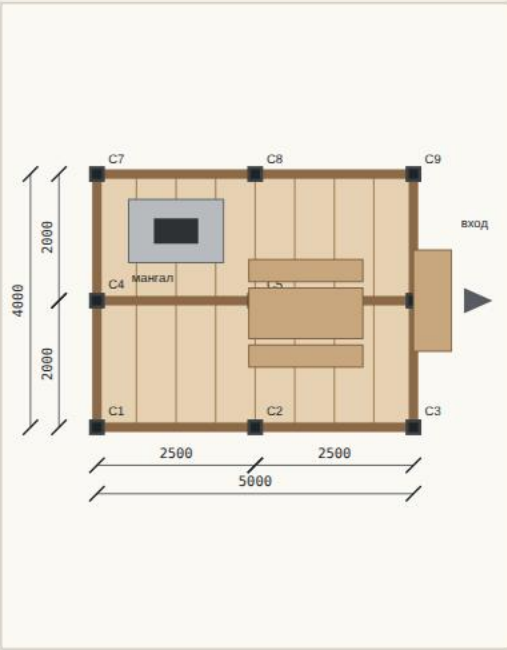

C1–C9 — сваи по сетке 2,5×2,0 м.
Ростверк — брус 150×150 по трём рядам свай и по краям.
Лаги 50×200 с шагом 625 мм перекрывают пролёт 2 м.
Стойки 150×150 — 8 шт по периметру, над средней сваей стойки нет.
Вход с востока, со стороны дорожки к дому. Стол со скамьями на 6 человек, мангал в заднем левом углу.

Сваи и нагрузки

- Сваи СВС-108 длиной 2,5 м, лопасть 300 мм, закручиваются до –2,2 м — ниже глубины промерзания 1,4 м, поэтому пучение их не выталкивает.
- Расчётная нагрузка: снег III района, люди на полу, собственный вес — всего ≈ 12,0 т. На среднюю сваю ≈ 3,0 т, на крайние ≈ 1,5 т, на угловые ≈ 0,8 т. Свая Ø108 в суглинке держит 5-7 т; несущую способность проверяют по моменту закручивания на первой свае.
- Головы свай выводятся в один уровень (+0,20) по нивелиру, ствол заполняется бетоном М300, оголовки привариваются.
- Мангал ставится только на стальной лист 1,5×1,0 м, не ближе 1 м к стойкам. Для кирпичной печи-барбекю нужен отдельный фундамент рядом с беседкой (опция).
- Электрика — от ЩР-Д отдельной линией (лист 05): 3 светильника и 3 розетки IP54.


Спецификация и стоимость

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Сваи винтовые СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком 250×250×6	шт	9	5 600	50 400
2	Бетон М300 для заполнения ствола, антикор для надземной части	компл	1	4 500	4 500
3	Брус 150×150×6000 камерной сушки: ростверк, верхняя обвязка, 8 стоек	шт	11	3 600	39 600
4	Доска 50×200×4000 — лаги пола, шаг 625	шт	9	950	8 550
5	Террасная доска лиственница 28×140 (20 м² + 10 %)	м²	22	2 300	50 600
6	Доска 50×150×6000 — стропила, затяжки, конёк	шт	16	900	14 400
7	Доска 25×100×6000 — обрешётка и контробрешётка	шт	20	290	5 800
8	Гидроветрозащита кровли, 35 м²	рул	1	3 100	3 100
9	Металлочерепица 0,5 мм, полиэстер RAL 8017	м²	36	820	29 520
10	Конёк, ветровые и карнизные планки, кровельные саморезы	компл	1	8 000	8 000
11	Вагонка сосна: фронтоны и подшивка свесов	м²	13	700	9 100
12	Ограждение h 0,9 м: перила, балясины, крепёж	м	14	1 700	23 800
13	Ступени из лиственницы, 2 подъёма	компл	1	9 000	9 000
14	Крепёж: шпильки к оголовкам, уголки, опоры бруса, саморезы	компл	1	11 000	11 000
15	Антисептик 10 л (1 шт) и масло для террасы 2,5 л (2 шт)	компл	1	6 200	6 200
16	Лист стальной 2 мм 1,0×1,5 м под мангал	шт	1	3 500	3 500
17	Работы: закрутка свай, выравнивание, бетонирование, оголовки	шт	9	2 800	25 200
18	Работы: ростверк, лаги, стойки, верхняя обвязка	компл	1	34 000	34 000
19	Работы: стропильная система и кровля	компл	1	28 000	28 000
20	Работы: настил, ограждение, ступени	компл	1	21 000	21 000
21	Работы: антисептирование и покрытие маслом	компл	1	8 000	8 000
22	Доставка материалов	рейс	1	6 000	6 000

Итого беседка

399 270


Разрез поперёк конька

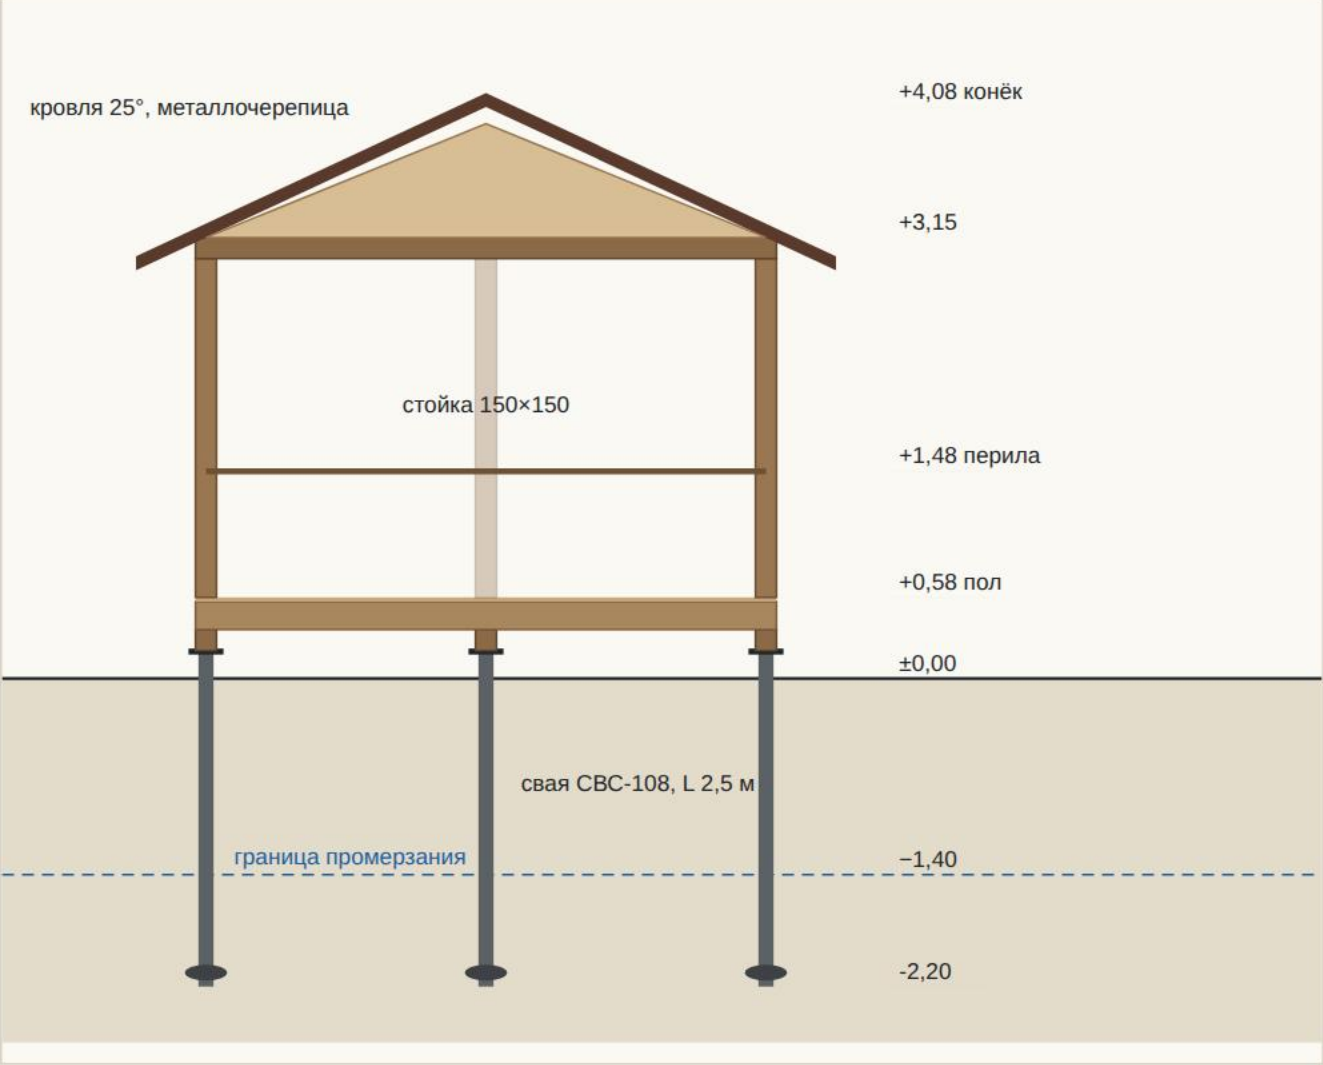

Дом каркасный 9,0 × 11,5 м

По рабочему эскизу заказчика, развёрнут: терраса в сад, вход через прихожую со стороны калитки. 3 спальни, кухня-гостиная 17,5 м², санузел и котельная у уличного фасада. Отметки инженерных вводов — по проверке сетей.

План, размеры по осям · сети дома

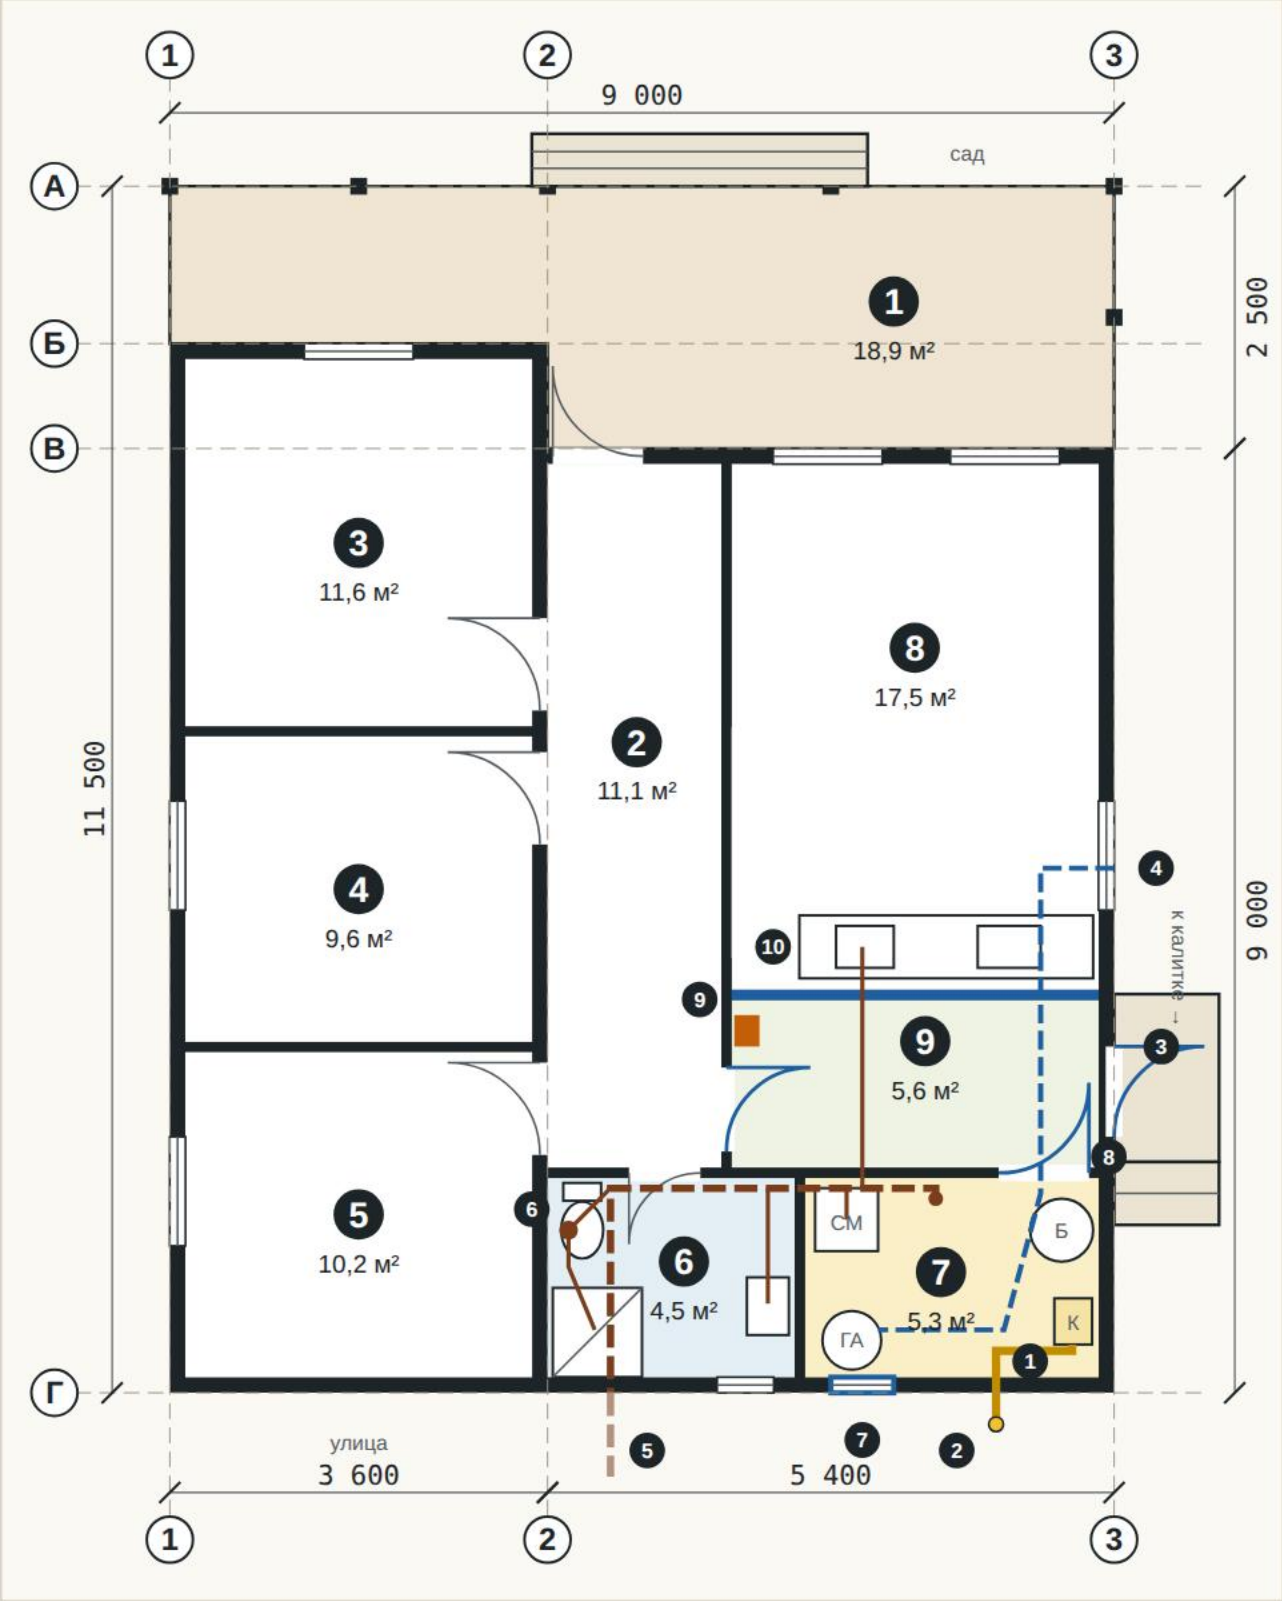

- 1

Котёл газовый конденсационный 24 кВт, закрытая камера, на правой наружной стене котельной; дымоход Ø80/125 вертикально через кровлю
- 2

Ввод газа через уличную стену прямо в котельную, +0,4 от пола: стояк на фасаде, от ШГ 5,8 м под землёй
- 3

Вход со стороны калитки: металлическая дверь 860 в правой стене, открывание наружу, крыльцо 1,0 × 1,6 с козырьком и 2 ступенями к дорожке
- 4

Ввод В1 от скважины в подполье у правой стены, по подполью 4,3 м в котельную (гидроаккумулятор ГА, автоматика)
- 5

Выпуск К1 через уличную стену под санузлом, 3,5 м до КК-4; в утеплённом футляре с греющим кабелем
- 6

Фановый стояк у унитаза, вентиляция через левый скат кровли
- 7



Окно 0,6×0,8 м в котельную на уличном фасаде — в эскизе окна нет; 1,0 м от газового стояка
- 8

Дверь котельной 0,86 м (вместо Д-3 0,66), открывание в прихожую, решётка 0,02 м²
- 9

ЩР-Д в прихожей на перегородке П-1; кабель от ВРУ входит через уличную стену
- 10

Кухонный фронт 2,8 м вдоль новой перегородки прихожей: мойка Ø50 в коллектор, варочная панель электрическая

Вид с улицы: уличный фасад и левая стена (схема)

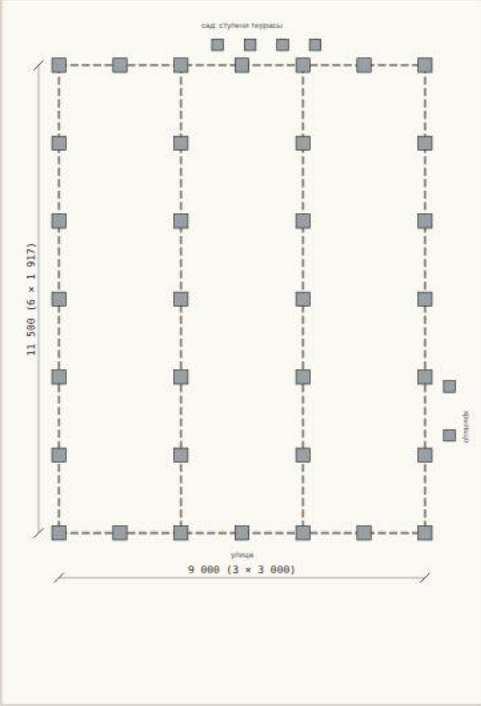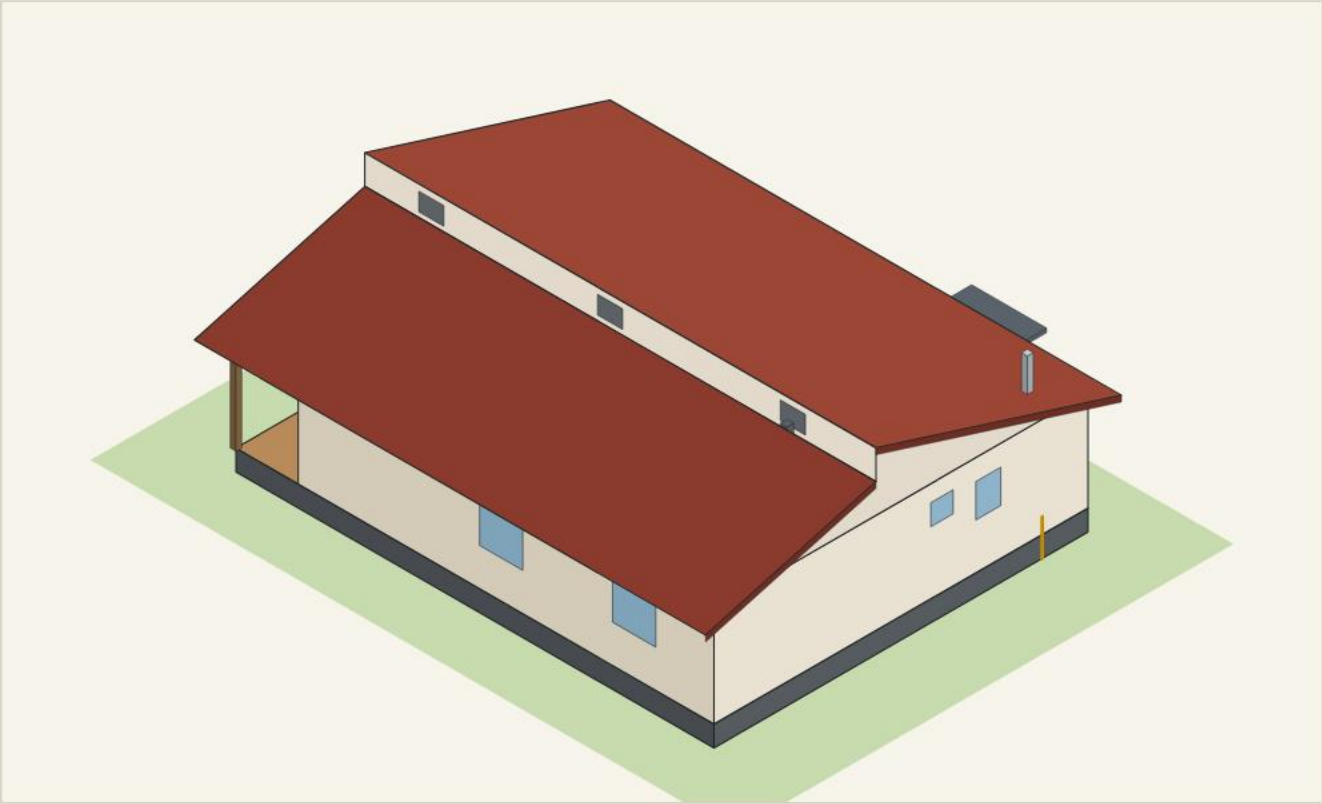

Фундамент по эскизу: 4 продольных ряда опор (оси через 3,0 м), в ряду 7 опор с шагом ≈ 1,92 м; по торцам — дополнительные опоры через 1,5 м. Всего 34 + 4 под ступени террасы + 2 под крыльцо входа.

Принято: винтовые сваи СВС-108×2500 до −2,2 м (ниже промерзания 1,4 м), обвязка — брус по сваям. Пол ≈ +0,5.

Высоты кровли на виде — по фасадам эскиза ориентировочно: карнизы ≈ +2,9, верх левого ската ≈ +3,9, правого ≈ +4,6, между скатами — вентилируемый фриз.

Цоколь — по тёплому контуру; продухи — на левой и садовой стороне, не ближе 0,5 м к газовому стояку. Под террасой — декоративная обшивка.

Экспликация

№	ПОМЕЩЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТО ПО СЕТЯМ)	ПЛОЩАДЬ, м²
1	Терраса в сад (открытая, под общей кровлей)	18,9
2	Холл-коридор, выход на террасу	11,1
3	Спальня	11,6
4	Спальня	9,6
5	Спальня	10,2
6	Санузел: душ, унитаз, умывальник	4,5
7	Котельная-постирочная: газовый котёл, бойлер, насосная	5,3
9	Прихожая — вход со стороны калитки (выгорожена из пом. 8)	5,6
8	Кухня-гостиная	17,5
Общая площадь по эскизу (с террасой)		94,7
Тёплый контур, пом. 2-9 (8 и 9 — бывшая кухня-гостиная 23,5 м²)		75,8
Площадь застройки 9,0 × 11,5		103,5

Замечания к эскизу по сетям

- 1. Дом развёрнут и отзеркален.** Терраса (ось А) смотрит в сад, на баню и беседку; уличный фасад (ось Г) — с окнами санузла и котельной. Простой поворот на 180° поставил бы спальни к дорожке от калитки, а кухню и котельную — к левой меже; зеркальный план держит кухню, прихожую и котельную у калитки. Исполнитель строит план зеркально — конструктив не меняется.
- 2. Вход со стороны калитки.** В эскизе единственная входная дверь — с террасы в холл. Из кухни-гостиной у уличного конца выгорожена прихожая 3,5 × 1,6 м (5,6 м²) с металлической дверью 860 в правой стене; из прихожей — дверь в холл (800) и в котельную. Кухня-гостиная — 17,5 м². Дверь с холла на террасу остаётся (выход в сад).
- 3. Назначение помещений в эскизе не подписано.** Принято: 6 — санузел (окно О-2), 7 — котельная-постирочная, 8 — кухня-гостиная, 3-5 — спальни. [\[подтвердить у заказчика\]](#)
- 4. Котельная для газового котла:** добавить окно 0,6×0,8 м (0,48 м² ≥ 0,40), дверь 860 вместо Д-3 660, потолок 2,5 м вместо «до 2,300». Котельная граничит с прихожей и санузлом — не со спальнями и не с кухней.
- 5. Мокрые точки — у уличного фасада:** коллектор под полом ≈ 5 м, выпуск через уличную стену, 3,5 м до КК-4; терраса больше не над выпуском.
- 6. Фундамент по эскизу** — 34 опоры + 4 под ступени террасы; плюс 2 сваи под крыльцо входа. Сваи СВС-108×2500, утеплённый цоколь по тёплому контуру (38 м).

Коммуникации дома

СЕТЬ	РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА 9,0×11,5
Канализация	Коллектор ПВХ Ø110 под полом ≈ 5 м: ревизия в котельной → вдоль перегородки санузла → выпуск —0,85 через уличную стену под санузлом, 3,5 м до КК-4 (лист 03). Мойка — Ø50 под прихожей.
Водопровод	Ввод ПНД Ø32 через правую стену в 5,0 м от уличного фасада, по утеплённому подполью 4,3 м в котельную. До санузла и кухни 1–3 м.
Газ	ШГ на заборе левее калитки, Г1 по прямой 5,8 м к уличному фасаду (под К1 с зазором 0,43 м), стояк на фасаде, ввод прямо в котельную (лист 10).
Электрика	ВРУ → ЩР-Д: ВБбШв 5×10, 16 м, ввод через уличную стену. ЩР-Д в прихожей; кабели к постройкам — по подполью и под террасой в сад (лист 05).
Вентиляция	Вытяжка санузла и котельной — каналами через кровлю; кухня — зонт с выбросом через кровлю; приточные клапаны в спальнях и котельной.

Стоимость под ключ (ориентир)


№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Каркасный дом «под ключ», тёплый контур 75,8 м² (пом. 2-9): каркас, утепление 200 мм, кровля с фризом, окна ПВХ, двери, внутренняя отделка, электрика, водопровод и канализация внутри, сантехника	м²	75,8	60 000	4 548 000
2	Терраса 18,9 м² под общей кровлей: настил, ограждение, стойки	м²	18,9	14 000	264 600
3	Ступени террасы в сад 3,2 × 0,5 м, 3 подъёма, на 4 опорах	компл	1	38 000	38 000
4	Крыльцо входа у калитки 1,0 × 1,6 м на 2 винтовых сваях, 2 ступени, козырёк 1,1 × 1,8 м	компл	1	46 000	46 000
5	Перепланировка по эскизу: перегородка прихожей 3,5 м, дверь прихожая — холл 800, металлическая входная дверь 860 в правой стене; на террасу — утеплённая дверь 860 вместо металлической	компл	1	42 000	42 000
6	Винтовые сваи СВС-108×2500 с оголовками: 34 под дом и террасу + 4 под ступени	шт	38	5 600	212 800
7	Монтаж свай: закрутка, выравнивание, бетонирование ствола	шт	38	2 800	106 400
8	Утеплённый цоколь по тёплому контуру 38 м: ЭППС 100 мм, профлист, продухи, гильзы под сети	м	38	2 100	79 800
9	Котельная: газовый конденсационный котёл 24 кВт с закрытой камерой, бойлер косвенного нагрева 100 л, обвязка (газоснабжение — лист 10)	компл	1	145 000	145 000
10	Вентиляция: вытяжки санузла и котельной через кровлю, кухонный зонт, приточные клапаны ×4	компл	1	46 000	46 000
Итого дом (ориентир)				5 528 600	

Цена за м² — средняя по подрядчикам каркасных домов Московской обл., сентябрь 2026; окончательная — [\[по смете исполнителя эскиза\]](#). Не входит: газоснабжение (лист 10), наружные сети, мебель и техника. Доработки эскиза по котельной (окно, дверь, потолок) — в смете листа 10.

Баня 5,7×6 м


Комната отдыха 8 м² и маленькая спальня 3,7 м², парная с Г-образными полками в 2 яруса, раздевалка перед мокрой зоной, отдельные моечная и туалет, минимальная бойлерная с уличным входом. Брус 150×150 на утеплённой плите.

План, размеры по осям

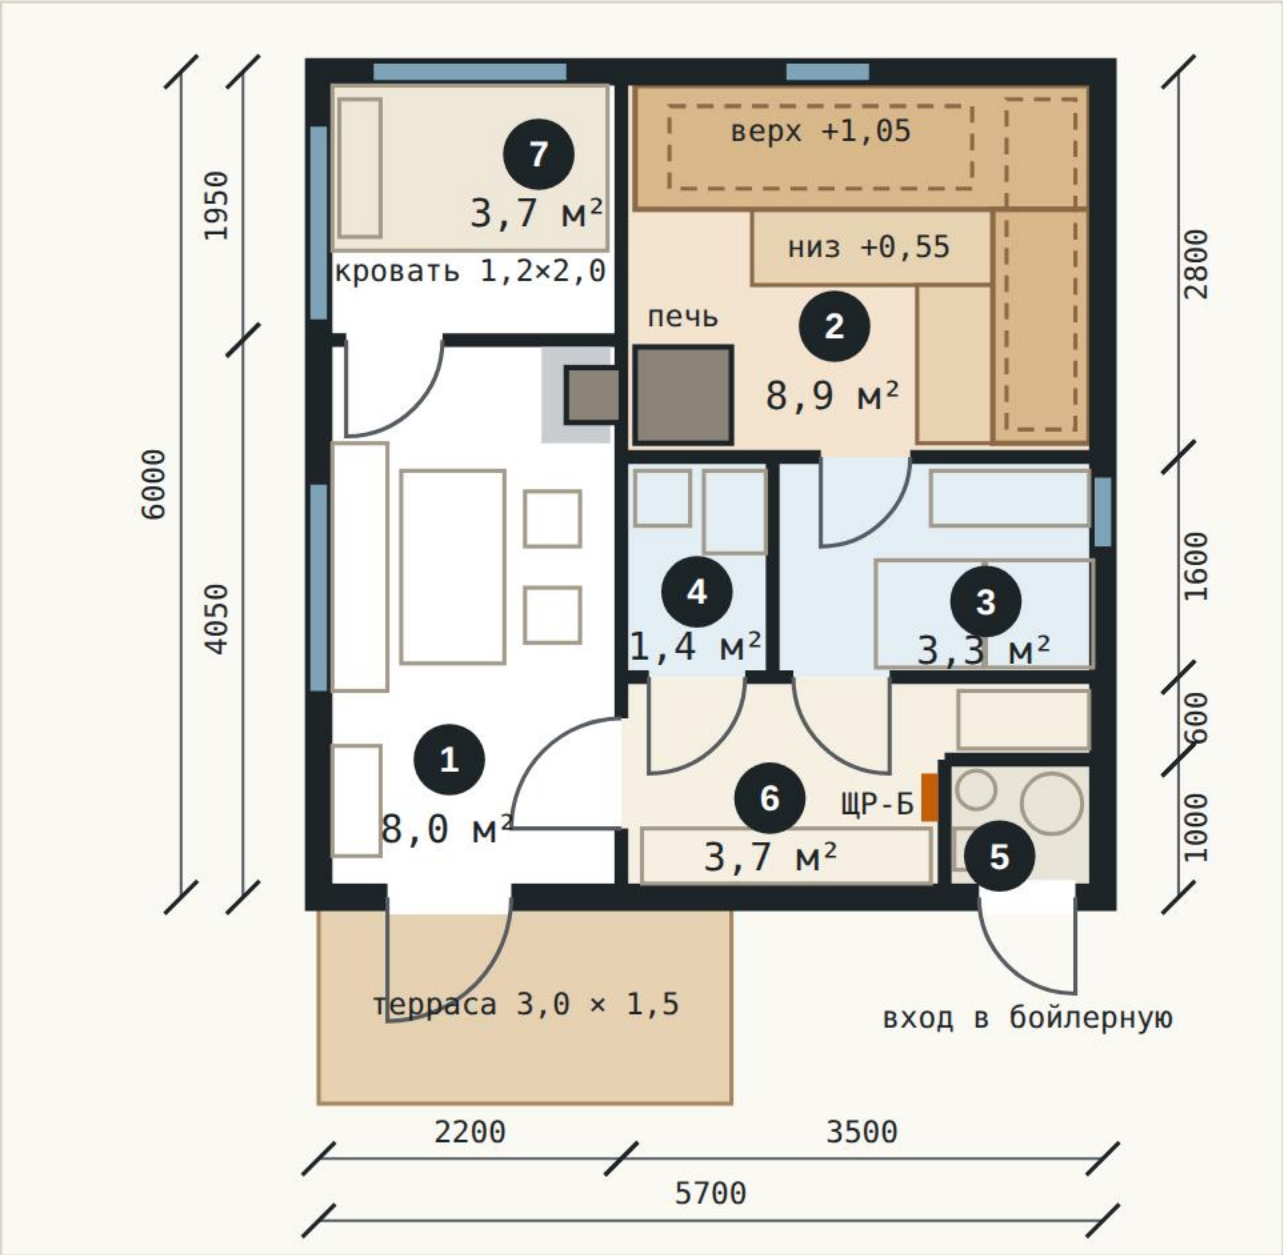


Пунктиром — двое лёжа на верхнем ярусе: вдоль тыльной и вдоль правой стены. Печь топится из комнаты отдыха, дверца со стеклом, перед топкой — металлический лист 0,5×0,7 м. Справа — цепочка размеров мокрого блока.

Вид от дома

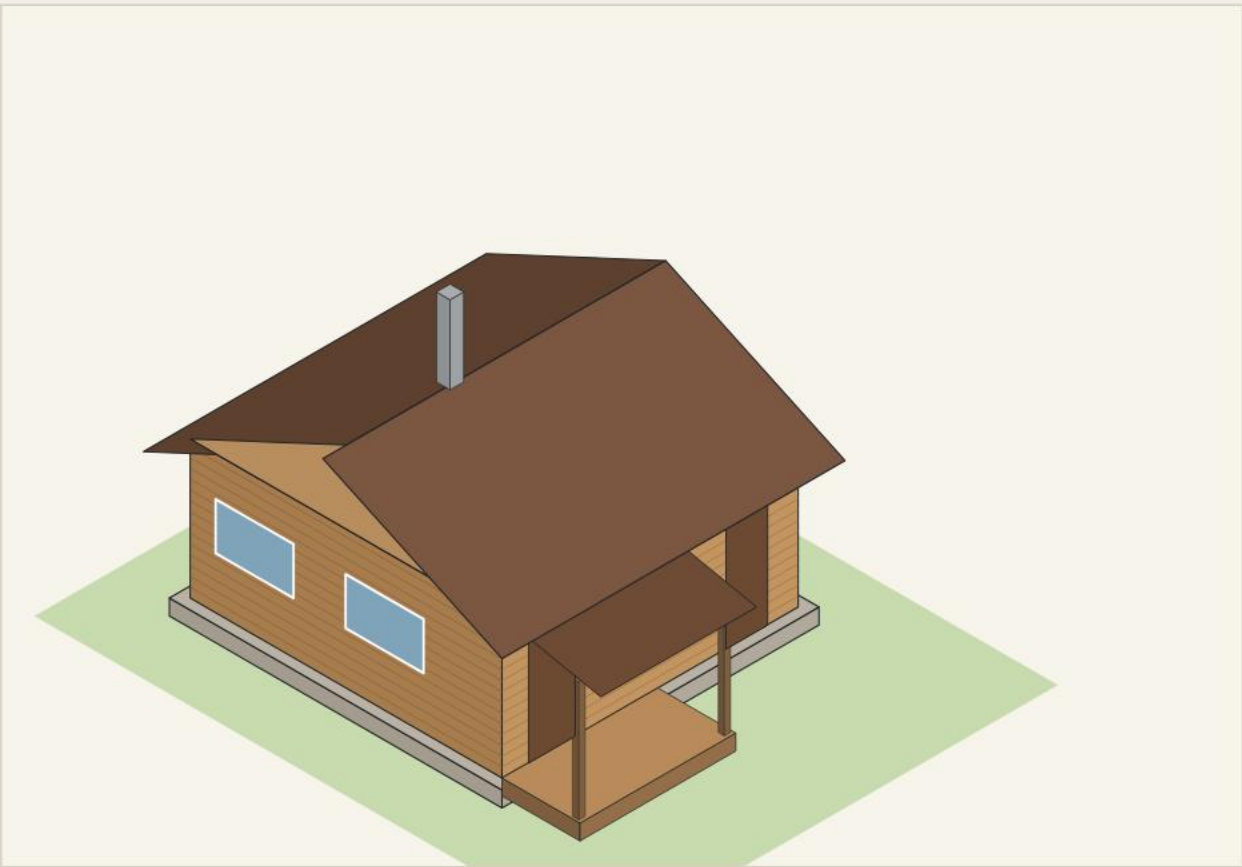

Разрез парной поперёк тыльных полков

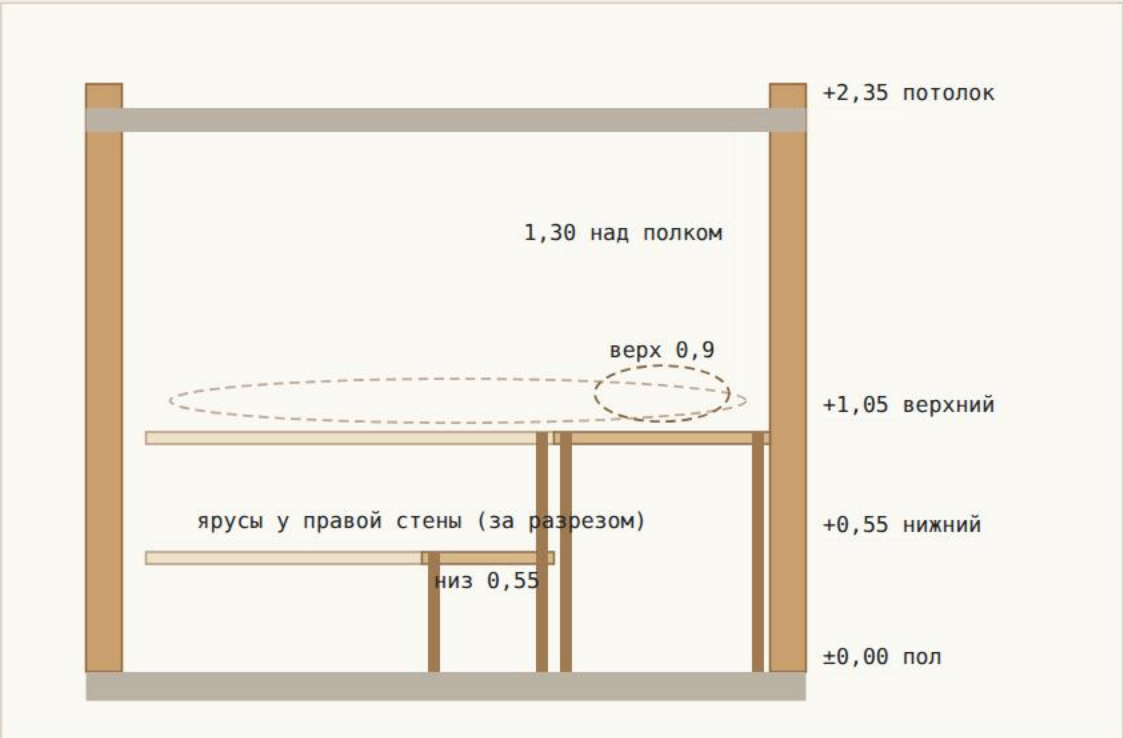

Экспликация помещений

№	ПОМЕЩЕНИЕ	РАЗМЕР, М	ПЛОЩАДЬ, М²
1	Комната отдыха	2,05 × 3,90	8,0
2	Парная	3,35 × 2,65	8,9
3	Моечная	2,25 × 1,45	3,3
4	Туалет	0,95 × 1,45	1,4
5	Бойлерная	1,00 × 0,85	0,85
6	Раздевалка	2,20 × 1,45 + ниша 1,15 × 0,45	3,7
7	Спальня	2,05 × 1,80	3,7
Итого полезная площадь (без террасы 4,5 м²)			29,8

Решения

- Комната отдыха 2,05×3,90 м (8 м²): стол с лавкой на 4–6 человек, вешалка у входа, выход на крытую террасу 3,0×1,5. Кухонной зоны больше нет. Печь по-прежнему топится отсюда: перед топкой металлический лист 0,5×0,7 м, от дверцы до противоположной стены 1,9 м (норма ≥ 1,25).
- Спальня 2,05×1,80 м (3,7 м²) — на месте кухонной зоны, у тыльной стены: кровать 1,2×2,0 м под окном, второе окно в боковой стене, дверь 0,7 м открывается в комнату отдыха. Перегородка примыкает к стене парной в 0,2 м от портала топки — торец перегородки и стена у портала закрыты негорючим экраном.
- Парная 3,35×2,65 м в свету, полки Г-образно вдоль тыльной и правой стен в 2 яруса. Верхний ярус +1,05: вдоль тыльной стены 3,3×0,9 м, вдоль правой 2,6×0,7 м — двое лежат в полный рост (2,2 и 2,4 м), над полком 1,3 м. Нижний ярус +0,55, глубина 0,55 м — сидеть и подниматься вверх; вместе на полках сидят 6–8 человек. Печь в ближнем левом углу за кирпичным экраном, до полков ≥ 0,45 м; стеклянная дверь 0,65 м открывается наружу, в моечную.
- Раздевалка 3,7 м² — между комнатой отдыха и мокрой зоной: лавка вдоль фасадной стены, шкафчики и вешалка в нише, щит ЩР-Б. Из неё двери в моечную и туалет, обе открываются в раздевалку. Путь: комната отдыха → раздевалка → моечная → парная.
- Моечная уменьшена с 4,0 до 3,3 м²: два душа 0,8×0,8, лавка, окно над лавкой, дверь из парной на прежнем месте. Туалет — с 1,6 до 1,4 м² (0,95×1,45 м при норме ширины ≥ 0,8 м): унитаз у стояка, маленький умывальник.
- Бойлерная уменьшена с 1,7 до 0,85 м² — 1,00×0,85 м в свету, дверь 0,7 м с улицы, обслуживание из проёма. Вместо водонагревателя и отдельного бака от печи — один комбинированный водонагреватель 100 л (ТЭН 2 кВт + змеевик от теплообменника печи, циркуляционный насос), рядом мембранный бак, фильтры и ввод В1. Нагрев электрический, поэтому норм на объём помещения нет; меньше не получится — водонагреватель Ø 0,45 м плюс зазор для обслуживания.
- Посадка на участке: 1,5 м до правого и тыльного забора; до дома 9,0×11,5 — 9,8 м от стены бани и 8,7 м от террасы бани (норма ≥ 8).

Стоимость под ключ (ориентир)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Фундамент — утеплённая плита (УШП) 5,7×6 с закладкой К1 и В1	м²	34,2	9 500	324 900
2	Стеновой комплект: профилированный брус 150×150 камерной сушки, межвенцовый утеплитель, нагели	м³	19	28 000	532 000
3	Сборка сруба с перегородками	м³	19	7 000	133 000
4	Кровля двускатная 25°: стропила, утепление 200 мм, металлочерепица, водосток	м²	49	3 200	156 800
5	Терраса 3,0×1,5 м с навесом	компл	1	75 000	75 000
6	Окна (5 шт) и двери: входная, уличная в бойлерную, 4 межкомнатные (спальня, раздевалка, моечная, туалет), стеклянная в парную	компл	1	182 000	182 000
7	Парная под ключ: фольгированная изоляция, вагонка абаш, Г-образные полки в 2 яруса вдоль двух стен (липа/абаш, ≈ 6,2 м²), подголовники, свет за экраном	компл	1	245 000	245 000
8	Печь дровяная с выносной топкой в комнату отдыха, теплообменник с подключением к водонагревателю, дымоход-сэндвич, разделка и экран	компл	1	165 000	165 000
9	Моечная и туалет: гидроизоляция, плитка, 2 душа, трап, унитаз, умывальник	компл	1	175 000	175 000
10	Бойлерная: комбинированный водонагреватель 100 л (ТЭН + змеевик от печи), циркуляционный насос, мембранный бак, фильтры, коллектор	компл	1	82 000	82 000
11	Отделка комнаты отдыха, спальни и раздевалки: вагонка, пол из доски, потолок	м²	15,4	4 500	69 300
12	Вентиляция: приток-вытяжка в парной и моечной, вытяжка в туалете и раздевалке	компл	1	42 000	42 000
13	Перегородка и дверь спальни, негорючий экран у портала топки, металлический лист перед топкой	компл	1	26 000	26 000
14	Антисептирование и покраска фасада	компл	1	48 000	48 000
15	Доставка, леса, вывоз мусора	компл	1	55 000	55 000
Итого баня (ориентир)				2 311 000	

Электрика бани (щит, свет, розетки) и подводка воды и канализации — в листах 03-05.

Проверка сетей под новый дом

Дом 9,0×11,5 развёрнут: терраса в сад, вход со стороны калитки. Что изменилось в сетях, какие ошибки найдены и исправлены, что остаётся решить.

11

11 416 637 ₺

смета участка (было 12 444 556 ₺)

8

ошибок прежних вариантов исправлено

3

доработки эскиза по котельной: окно, дверь, потолок

46 / 5,8 / 12,5 м

К1 / Г1 под землёй / траншея В1

Разворот дома — что изменилось

СЕТЬ / ОБЪЕКТ	БЫЛО (ТЕРРАСА К УЛИЦЕ)	СТАЛО (ТЕРРАСА В САД, ВХОД ОТ КАЛИТКИ)
Дом	терраса и вход с неё — к улице; санузел и котельная — у тыльной стены	развёрнут и отзеркален: терраса в сад, спальни слева; справа, у дорожки от калитки — прихожая 5,6 м² с входной дверью и крыльцом, кухня-гостиная 17,5 м², котельная и санузел — у уличного фасада
Канализация К1	коллектор ≈ 11 м под холлом, выпуск под террасой 6,0 м до КК-4 с греющим кабелем 3,5 м	коллектор ≈ 5 м, выпуск через уличную стену 3,5 м до КК-4; вход в ЛОС —1,39
Водопровод В1	по подполью 5,5 м к котельной у тыльной стены	траншея та же (12,5 м), по подполью 4,3 м к котельной у уличного фасада
Газ Г1	под землёй 13,6 м в обход дома + 8,0 м по правой стене	по прямой 5,8 м от ШГ к уличному фасаду + стояк 1,5 м; ввод прямо в котельную
Электрика	ЩР-Д в холле; кабели к постройкам выходят у тыльной стены	ЩР-Д в прихожей; ввод от ВРУ через уличную стену; кабели к постройкам — под террасой в сад
Дорожки	дорожка перед домом к ступеням у улицы	дорожка от калитки к крыльцу у правой стены; ступени террасы — к садовой дорожке
Смета участка	11 367 455 ₺ (терраса к улице)	11 416 637 ₺ (было 12 444 556 ₺ с модульным домом)

Ошибки прежних вариантов — исправлены

ЧТО БЫЛО НЕ ТАК	ТРЕБОВАНИЕ	КАК ИСПРАВЛЕНО
Длина кабельных траншей на листе 05 занижена на 5,7 м: не учтена общая ветка от магистрали к беседке и хозблоку	объём земляных работ и смета	траншеи 60 м вместо 54 (+3 600 ₺)
Линия К1 бани (КК-1 → КК-2) шла в 1,6 м от фундамента дома	норма 3,0 м, СП 42.13330, табл. 12.6	трасса на х = 21,0 — ровно 3,0 м
Кабель к ЛОС пересекал выпуск К1 дома у фасада с зазором ≈ 0,07 м	ПУЭ 2.3: ≥ 0,5 м, в трубе ≥ 0,25 м	кабель ЛОС выходит из подполья с левой стороны дома и К1 не пересекает
Кабель бани пересекал К1 бани у КК-Б с зазором ≈ 0,05 м (труба на −0,65, кабель на −0,70)	ПУЭ 2.3: в трубе ≥ 0,25 м	кабель на пересечении заглублён до −0,95 в гофре на 4 м — 0,30 м
Длины кабелей в таблице линий на 3–4 м больше, чем «трасса + 3,5 м», которые указаны в примечании	ΔU и спецификация считаются от длины	длина = трасса по генплану + 6 м для всех линий; ΔU пересчитано
Стальной футляр на пересечении В1 с К1 есть в тексте, но не в спецификации	—	добавлен в смету воды: 10 м, 9 500 ₺
Траншея К1 в смете «глубиной до 1,1 м», а у ЛОС лоток −1,38	глубина траншеи = лоток + постель	в смете траншея 0,8–1,5 м
Скважина — ЛОС: в проверке 29,0 м	по координатам генплана	29,8 м

Осталось решить

ВОПРОС	ЧТО СДЕЛАТЬ
Зеркальный план	исполнитель строит план эскиза зеркально (терраса в сад, кухня и вход справа) и выгораживает прихожую 5,6 м² из кухни-гостиной — согласовать с ним и с заказчиком.
Назначение помещений	в эскизе все подписаны «Комната». Принято: 6 — санузел, 7 — котельная, 8 — кухня-гостиная, 9 — прихожая. Подтвердить у заказчика.
Котельная (пом. 7)	в эскизе нет окна, дверь 660 мм, потолок до 2,3 м. Для газового котла нужны окно 0,6×0,8, дверь ≥ 0,8, высота ≥ 2,5 — передать исполнителю до начала работ (лист 10).
Разбивка К1 бани	трасса КК-1 — КК-2 одновременно в 3,0 м от дома и в 10,0 м от скважины, до свай крыльца — 2,0 м. Выносить геодезистом вместе с домом и крыльцом.
Вход в ЛОС	−1,39 при пределе «Лонг» −1,40. При монтаже уклон 0,02 не завышать; если выйдет глубже — исполнение «Супер Лонг».
ТУ Мособлгаза	место ШГ (левее калитки, прямо против котельной), давление в сети, котёл в котельной 2,8×1,9.
ПЗЗ и цена дома	зона и процент застройки (16,7 %) — по градплану; 5 528 600 ₺ за дом — ориентир, заменить сметой исполнителя.
